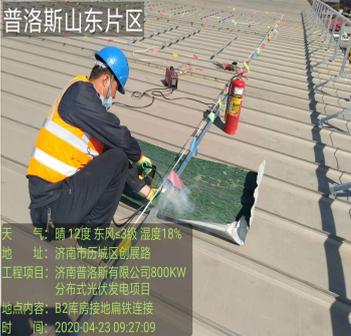


监 理 日 志 ()

日期：2020年4月23日 星期：四 天气：晴 气温：7-17℃

工程名称：普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查接地扁铁焊接问题有，直角拐弯、十字搭接处搭接面不足，焊渣及铁屑未清理，即令其整改消缺完成；</p> <p>2、接地扁铁搭接点防腐要求施工人员，必须刷防腐底漆；</p> <p>3、检查施工人员体温测量记录；</p> <p>4、检查接地扁铁搭接面长度；</p>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	<p>施工人员 3 人 。</p> <p>1、接地扁铁焊接完成开始防腐；</p>
	本日现场 监理员	黎建光
	记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
