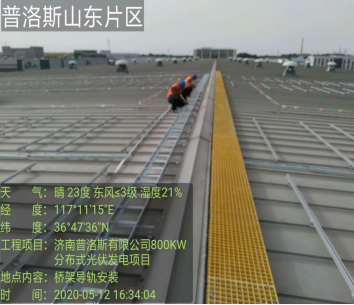
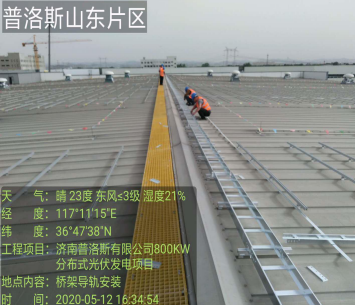


监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 12 日 星期: 二 天气: 晴 气温: 16-24℃
 工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、4 月 25 日至 5 月 11 日 B2 库房无人施工; 2、桥架进场垂直运输, 安装桥架及导轨完成 50% 3、查询施工人员体温; 普洛斯山东片区  天气: 晴 23度 东风<3级 湿度21% 经 度: 117°11'15"E 纬 度: 36°47'36"N 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: 桥架导轨安装 时 间: 2020-05-12 16:34:04 普洛斯山东片区  天气: 晴 23度 东风<3级 湿度21% 经 度: 117°11'15"E 纬 度: 36°47'38"N 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: 桥架导轨安装 时 间: 2020-05-12 16:34:54 				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">施工单位</th><th style="width: 80%;">施工情况</th></tr> <tr> <td style="text-align: center;">阳光电源有限公司</td><td> 施工人员 4 人 。 1、电缆穿管开洞完成; 2、桥架导轨安装完成, 主桥架连接完成 50% </td></tr> </table>	施工单位	施工情况	阳光电源有限公司	施工人员 4 人 。 1、电缆穿管开洞完成; 2、桥架导轨安装完成, 主桥架连接完成 50%
施工单位	施工情况				
阳光电源有限公司	施工人员 4 人 。 1、电缆穿管开洞完成; 2、桥架导轨安装完成, 主桥架连接完成 50%				
本日现场 监理员	黎建光				
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):				
