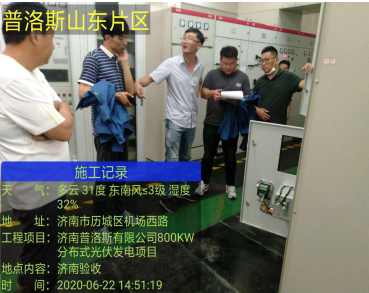
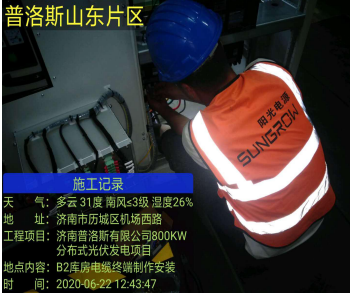
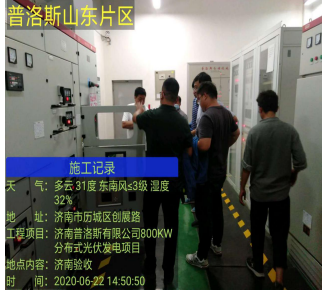
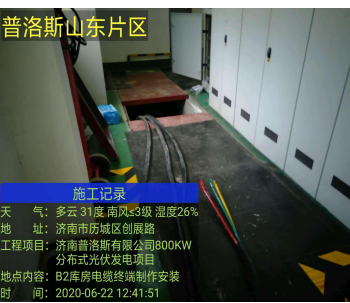


监理日志（ ）

日期： 2020 年 6 月 22 日 星期： yi 天气： 多云 气温： 22-32℃
 工程名称： 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录，检查现场安全施工； 2、从 5 月 24 日-6 月 21 日因组件隐裂问题长时间无人施工，期间厂家进场 EL 检测的问题，组件进场 864 块，厂家检测经地三方认证合格 715 块，不合格组件离场，缺失组件未进场 3、陪同济南电业局人员进行并网柜入网验收，符合要求同意装表并网发电；      
施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 6 人 1、组件吊装完成； 2、安装逆变器、并网柜电缆终端制作完成；
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
