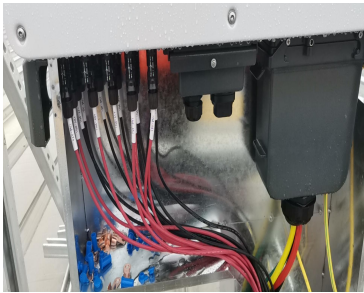


监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 6 月 23 日 星期: 二 天气: 阴 气温: 21-29℃

工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录, 检查现场安全施工; 2、巡检发现问题有桥架开孔铁屑未清理, 即找施工单位安排人员清理; 3、陪同济南电业局人员进行并网柜入网验收, 符合要求同意装表并网发电; 4、参加施工人员应急演练    	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 10 人 1、组件安装完成 715 块; 2、逆变器电缆终端制作完成 2 个;
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
