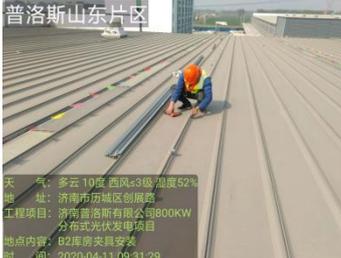


监 理 日 志 ()

日期： 2020 年 4 月 11 日 星期： 六 天气： 晴 气温： 4-18℃

工程名称： 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查并网柜消缺整改情况，发现侧板安装螺丝紧固不到位，令其重新紧固；</p> <p>2、安全检查发现库房加固整改人员在登高车上未使用安全带，立即令其佩戴安全带，并口头教育，警告管理人员安全防护措施实施。</p> <p>3、夹具安装检查发现夹具安装与瓦楞不到位，即令其整改消缺完成。</p> <p>4、施工人员体温检查记录；</p>					
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px;">普洛斯山东片区 天气：多云 9级 西风 3级 湿度 58% 地 址：济南市历城区创展路 工程项目：济南普洛斯南有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容：B2库房加固安装 时 间：2020-04-11 09:03:19</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px;">普洛斯山东片区 天气：多云 10级 西风 3级 湿度 52% 地 址：济南市历城区创展路 工程项目：济南普洛斯南有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容：B2库房夹具安装 时 间：2020-04-11 09:31:29</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px;">普洛斯山东片区 天气：多云 11度 西北风 3级 湿度 48% 地 址：济南市历城区机场西路 工程项目：济南普洛斯南有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容：并网柜消缺 时 间：2020-04-11 10:02:53</p> </div> </div>					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">施工单位</td> <td style="text-align: center;">施工情况</td> </tr> <tr> <td>阳光电源有限公司</td> <td> <p>施工人员 9 人。</p> <p>1、B2 库房夹具西侧放线安装完成；</p> <p>2、加固安装完成 80%；</p> <p>3、并网柜侧板安装；</p> </td> </tr> </table>	施工单位	施工情况	阳光电源有限公司	<p>施工人员 9 人。</p> <p>1、B2 库房夹具西侧放线安装完成；</p> <p>2、加固安装完成 80%；</p> <p>3、并网柜侧板安装；</p>	
施工单位	施工情况					
阳光电源有限公司	<p>施工人员 9 人。</p> <p>1、B2 库房夹具西侧放线安装完成；</p> <p>2、加固安装完成 80%；</p> <p>3、并网柜侧板安装；</p>					
本日现场 监理员	黎建光					
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：					
