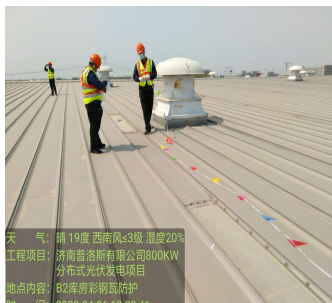


监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 6 日 星期: 一 天气: 晴 气温: 9-21℃

工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、B2 库房加固开始，巡检发现加固材料防腐不严，即令其重新防腐后使用； 2、检查爬梯上下安全措施情况； 3、支架夹具组装完成 60%，组装人员个别未戴口罩，即令其做好防护；  天 气: 晴 20度 西风<3级 湿度21% 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房加固 时 间: 2020-04-06 13:10:31  天 气: 晴 19度 西南风<3级 湿度20% 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房防腐 时 间: 2020-04-06 11:59:43  天 气: 晴 19度 西南风<3级 湿度20% 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2库房彩钢瓦防护 时 间: 2020-04-06 12:03:41	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	1、施工人员 9 人 2、库房加固完成 20%； 3、库房屋面采光带防护夹具组装；
	本日现场 监理员	黎建光
	记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
