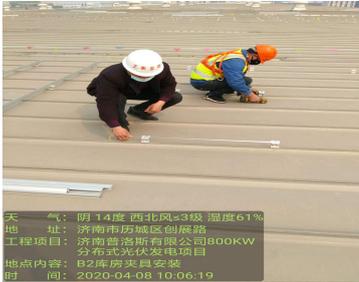
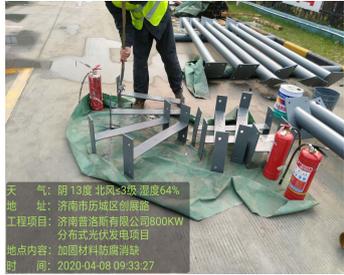


监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 8 日 星期: 三 天气: 多云 气温: 6-18℃

工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、B2 库房加固询问完成 50%，问题有防腐不严即令其消缺整改完成；</p> <p>2、现场抽查加固人员登高作业证，无人随身携带，令其随身携带已备检查；</p> <p>3、检查支架安装人员上下爬梯使用防坠器情况；</p> <p>4、巡检发现打导轨安装夹具间距达到 1.5 米，令其施工单位与设计单位确认，并汇报业主。夹具南北方向不齐令其拉线整改；</p>
	  
	 
施工单位	施工情况
阳光电源有限公司	<p>1、施工人员 9 人</p> <p>2、库房加固完成 50%；</p> <p>3、库房屋面夹具放线安装；</p>
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
