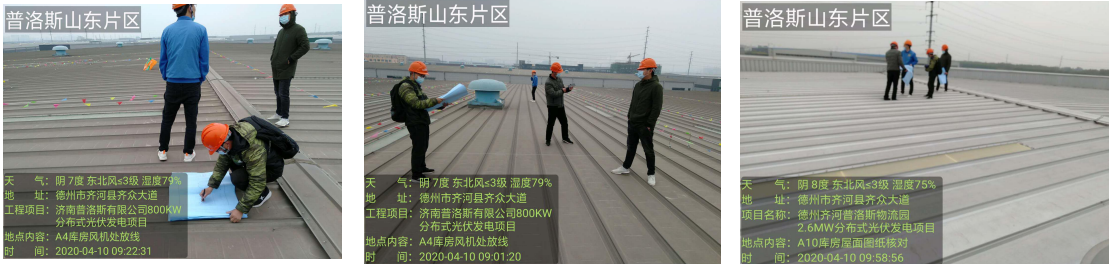


监理日志（ ）

日期： 2020 年 4 月 10 日 天气：阴 气温： 3-10℃ 星期： 五
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、召开工程监理例会； 2、A4 安装遮荫问题设计现场解决，拆一组南移，西 2 风机处东西距达不到设计要求，东移至第二采光带东。 3、核对 A10 屋面组件位置，风机与图纸也不附，确认顺移。 4、施工人员体温检查记录； 				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="292 1328 451 1361">施工单位</th><th data-bbox="451 1328 1436 1361">施工情况</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="292 1361 451 1821"> 阳光电源有限公司 </td><td data-bbox="451 1361 1436 1821"> 施工人员 6 人。 1、A10 库房夹具组装； 2、核对夹具安装位置 3、下午安装夹具 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工情况	阳光电源有限公司	施工人员 6 人。 1、A10 库房夹具组装； 2、核对夹具安装位置 3、下午安装夹具
施工单位	施工情况				
阳光电源有限公司	施工人员 6 人。 1、A10 库房夹具组装； 2、核对夹具安装位置 3、下午安装夹具				
本日现场 监理员	黎建光				
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				
