

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-033

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于光伏区电气施工存在的问题事宜

内容：

你单位在光伏 T1、T2 区电气施工中存在以下问题：

1. 箱、逆变 $\phi 16\text{mm}$ 接地圆钢未按设计变更图纸施工（沿箱、逆变平台四周 60mm 处敷设），箱、逆变与平台接地不规范， $\phi 16\text{mm}$ 接地圆钢未沿管桩引下敷设（在平台外直接引下，附图 1）
2. 光伏区防雷接地安装未按变更图纸施工，东西阵列两侧未打 L2.5m $\phi 50\text{mm}$ 镀锌圆钢接地极，直接用 $\phi 16\text{mm}$ 圆钢插入地下，局部搭接长度不够，焊接不规范（附图 2）。
3. 电缆敷设时电缆头暴露在外没有防水保护措施（附图 3）。

针对以上问题，望你单位按图施工，对问题立即整改。

限 2 日内回复

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：


2020.06.20

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。

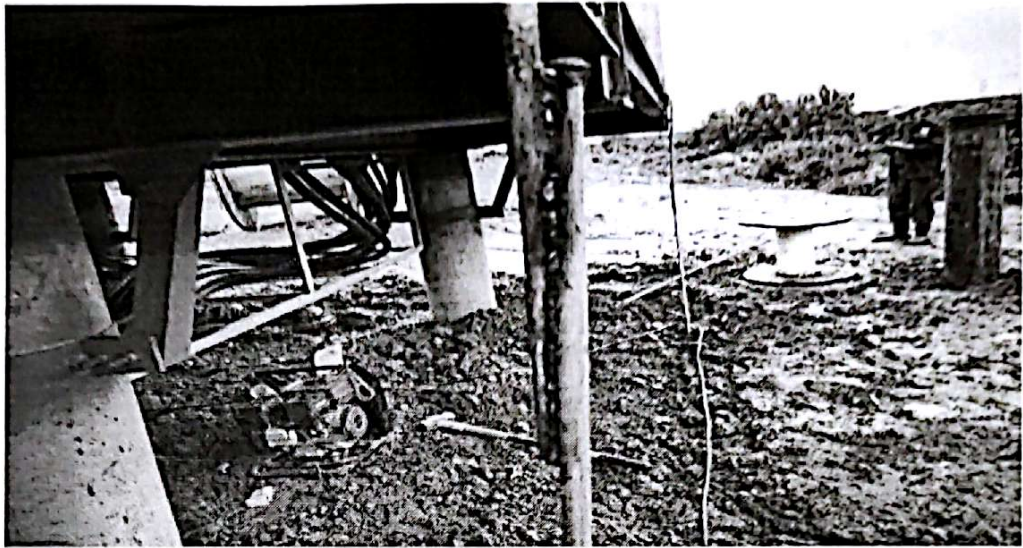


图 1

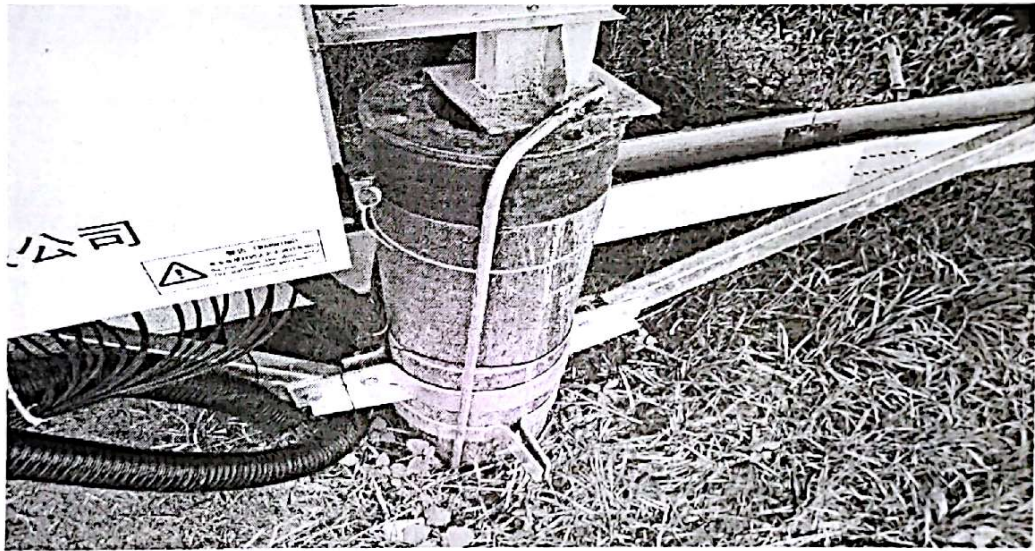


图 2



图 3
