

监 理 日 志

第 53 页 共 页

2020 年 04 月 25 日 星期：六	天气：晴	气温：13-31
<p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <ol style="list-style-type: none">1、今日安装组件 0MW，累计安装 6.2MW；2、今日导轨安装 0，累计安装 6.2MW；3、今日逆变器安装 0 台；累计安装 50 台；4、今日桥架安装完成 0m，累计安装完成 3600m。5、今日屋面直流电缆放线 1000m，累计完成 67000 米，电气接线；6、今日接地扁铁焊接安装 0m，累计完成 8600m；7、DSA1000 设备基础浇筑完成，钢结构加工，立柱全部安装完成，横梁安装完成 80%。8、3 号成品库下穿桥架完成，低压交流电缆敷设 2200 米，累计敷设 3800 米，生产车间 13ps、15ps 下穿桥架完成； <p>车棚进度：</p> <ol style="list-style-type: none">1、4 号车棚已移交给光伏施工单位；2、1-2-3 号车棚放线切割路面，1 号车棚基础开挖完成，2 号车棚开始基础开挖。 <p>三、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 安全监理情况：争针昨天开会提出安全管理及要求，今日现场开始进行安全检查及问题抽查，要求施工单位做好现场施工人员安全培训，每日进行班前教育，定期组织管理人员不定时抽查各屋面安全情况。2. 质量监理情况：检查车棚基础深度，深度符合要求，测量数据为 1.4M，对钢筋笼进行检查，钢筋型号符合图纸要求 <p>3. 现场施工人数：光伏区施工管理 4 人，工人 17 人；车棚区施工管理 1 人，工人 7 人</p> <p>三、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春 审核人：刘士发</p>		



时间: 2020.04.25 14:57
 天气: 晴 28℃
 地点: 合肥市·大陆马牌轮胎合肥有限公司(南2门)
 海拔: 49.0米
 方位角: 南 178°
 经纬度: 31.860740°N, 117.088630°E
 大陆马牌轮胎光伏发电项目: 厂外钢结构车棚基础

今日水印相机




时间: 2020.04.25 14:58
 天气: 晴 28℃
 地点: 合肥市·大陆马牌轮胎合肥有限公司(南2门)
 海拔: 49.0米
 方位角: 南 178°
 经纬度: 31.860740°N, 117.088630°E
 大陆马牌轮胎光伏发电项目: 厂外钢结构车棚基础

今日水印相机



时间: 2020.04.25 15:07
 天气: 晴 28℃
 地点: 合肥市·大陆马牌轮胎合肥有限公司(南2门)
 海拔: 45.3米
 方位角: 西 264°
 经纬度: 31.864487°N, 117.089727°E
 大陆马牌轮胎光伏发电项目: 钢结构车棚组件安装(5号问题已整改)

今日水印相机

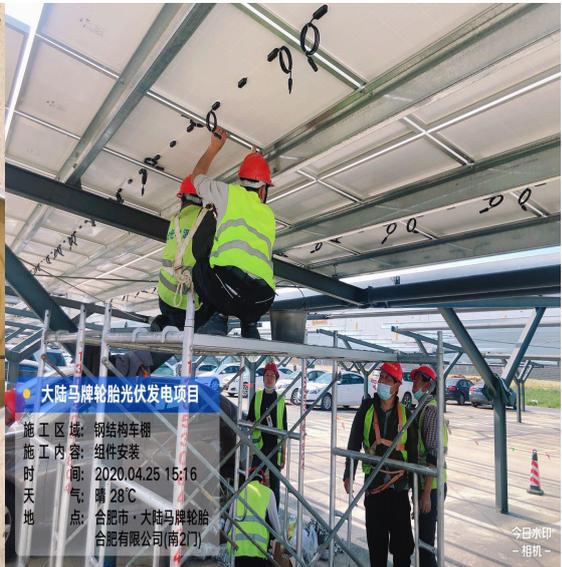

大陆马牌轮胎光伏发电项目
 施工区域: 钢结构车棚
 施工内容: 组件安装
 时间: 2020.04.25 15:16
 天气: 晴 28℃
 地点: 合肥市·大陆马牌轮胎合肥有限公司(南2门)

今日水印相机



大陆马牌轮胎光伏发电项目
 施工区域: 电缆穿管
 施工内容: 破路
 时间: 2020.04.25 16:23
 天气: 晴 28℃
 地点: 合肥市·大陆马牌轮胎合肥有限公司(南1门)

今日水印相机



大陆马牌轮胎光伏发电项目
 施工区域: 设备平台
 施工内容: 钢构吊装焊接
 时间: 2020.04.25 16:34
 天气: 晴 28℃
 地点: 合肥市·大陆马牌轮胎合肥有限公司(南1门)

今日水印相机
