

监理工程日报文字描述


工程名称: 江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 1 日	星期一	天气情况	晴	温度 21-29℃
施工部位	国强彩钢瓦屋面				
出勤人数	6 人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度 情 况	西区厂房夹具、轨道安装全部完成。 平顶屋面避雷扁铁焊接完成 90%。 西区厂房桥架铺设安装完成 30%。			
	施工质量 情 况	符合设计要求。			
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	暂无材料进场			
	监理发出指 令情况	无			
	次日工作 安 排	彩钢瓦屋面桥架铺设安装。			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
填 报 人	许青松		审 核 人	于彬	

监理工程日报影像

工程名称：江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 1 日	星期一	天气情况	晴	温度 21-29℃
施工现场影像					
 工程记录 施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目 施工内容: 桥架安装 拍摄时间: 2020.06.01 09:24 天气: 多云 24℃ 地点: 启东市吕四港镇·范公堤路 海拔: 6.7米 经纬度: 121.530335°E 32.066323°N 今日水印 - 相机 -  工程记录 施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目 施工内容: 桥架安装 拍摄时间: 2020.06.01 09:26 天气: 阴 25℃ 地点: 启东市吕四港镇·范公堤路 海拔: 6.7米 经纬度: 121.530099°E 32.066434°N 今日水印 - 相机 -					

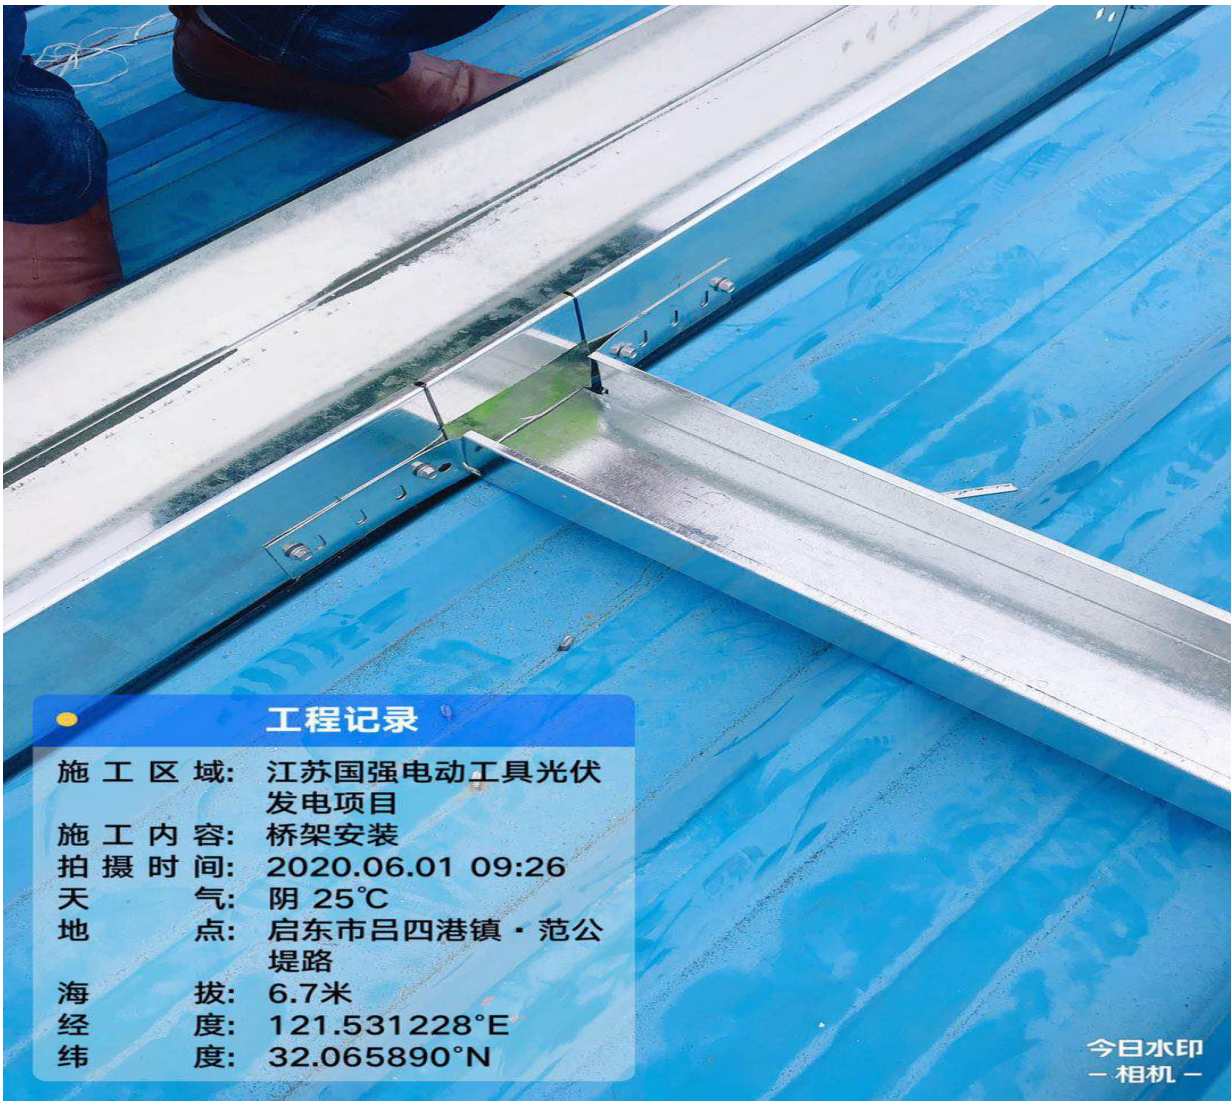

编 写 人	许青松	审 核 人	于彬
-------	-----	-------	----
