


监理工程日报文字描述


工程名称: 江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 2 日	星期二	天气情况	晴	温度 22-32℃
施工部位	国强彩钢瓦屋面				
出勤人数	6 人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度 情 况	西区厂房夹具、轨道安装全部完成。 平顶屋面避雷扁铁焊接完成 90%。 西区厂房桥架铺设安装完成 35%			
	施工质量 情 况	符合设计要求。			
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	暂无材料进场			
	监理发出指 令情况	无			
	次日工作 安 排	彩钢瓦屋面桥架铺设安装。			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
填 报 人	许青松		审 核 人	于彬	

监理工程日报影像

工程名称：江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

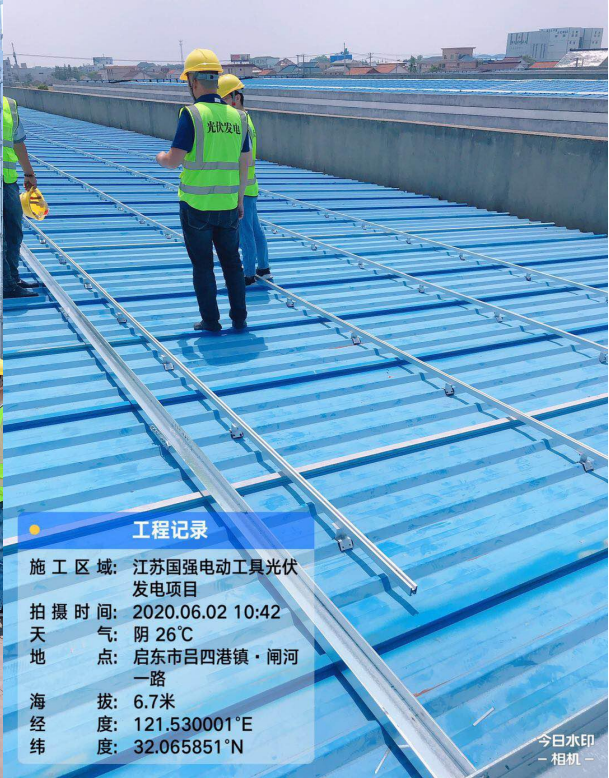日期	2020 年 6 月 2 日	星期二	天气情况	晴	温度 22-32℃
施工现场影像					
 工程记录 施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目 拍摄时间: 2020.06.02 10:40 天气: 阴 26℃ 地点: 启东市吕四港镇·闸河一路 海拔: 6.7米 经纬度: 121.529985°E 32.066046°N 今日水印 - 相机 -  工程记录 施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目 拍摄时间: 2020.06.02 10:42 天气: 阴 26℃ 地点: 启东市吕四港镇·闸河一路 海拔: 6.7米 经纬度: 121.530001°E 32.065851°N 今日水印 - 相机 -					

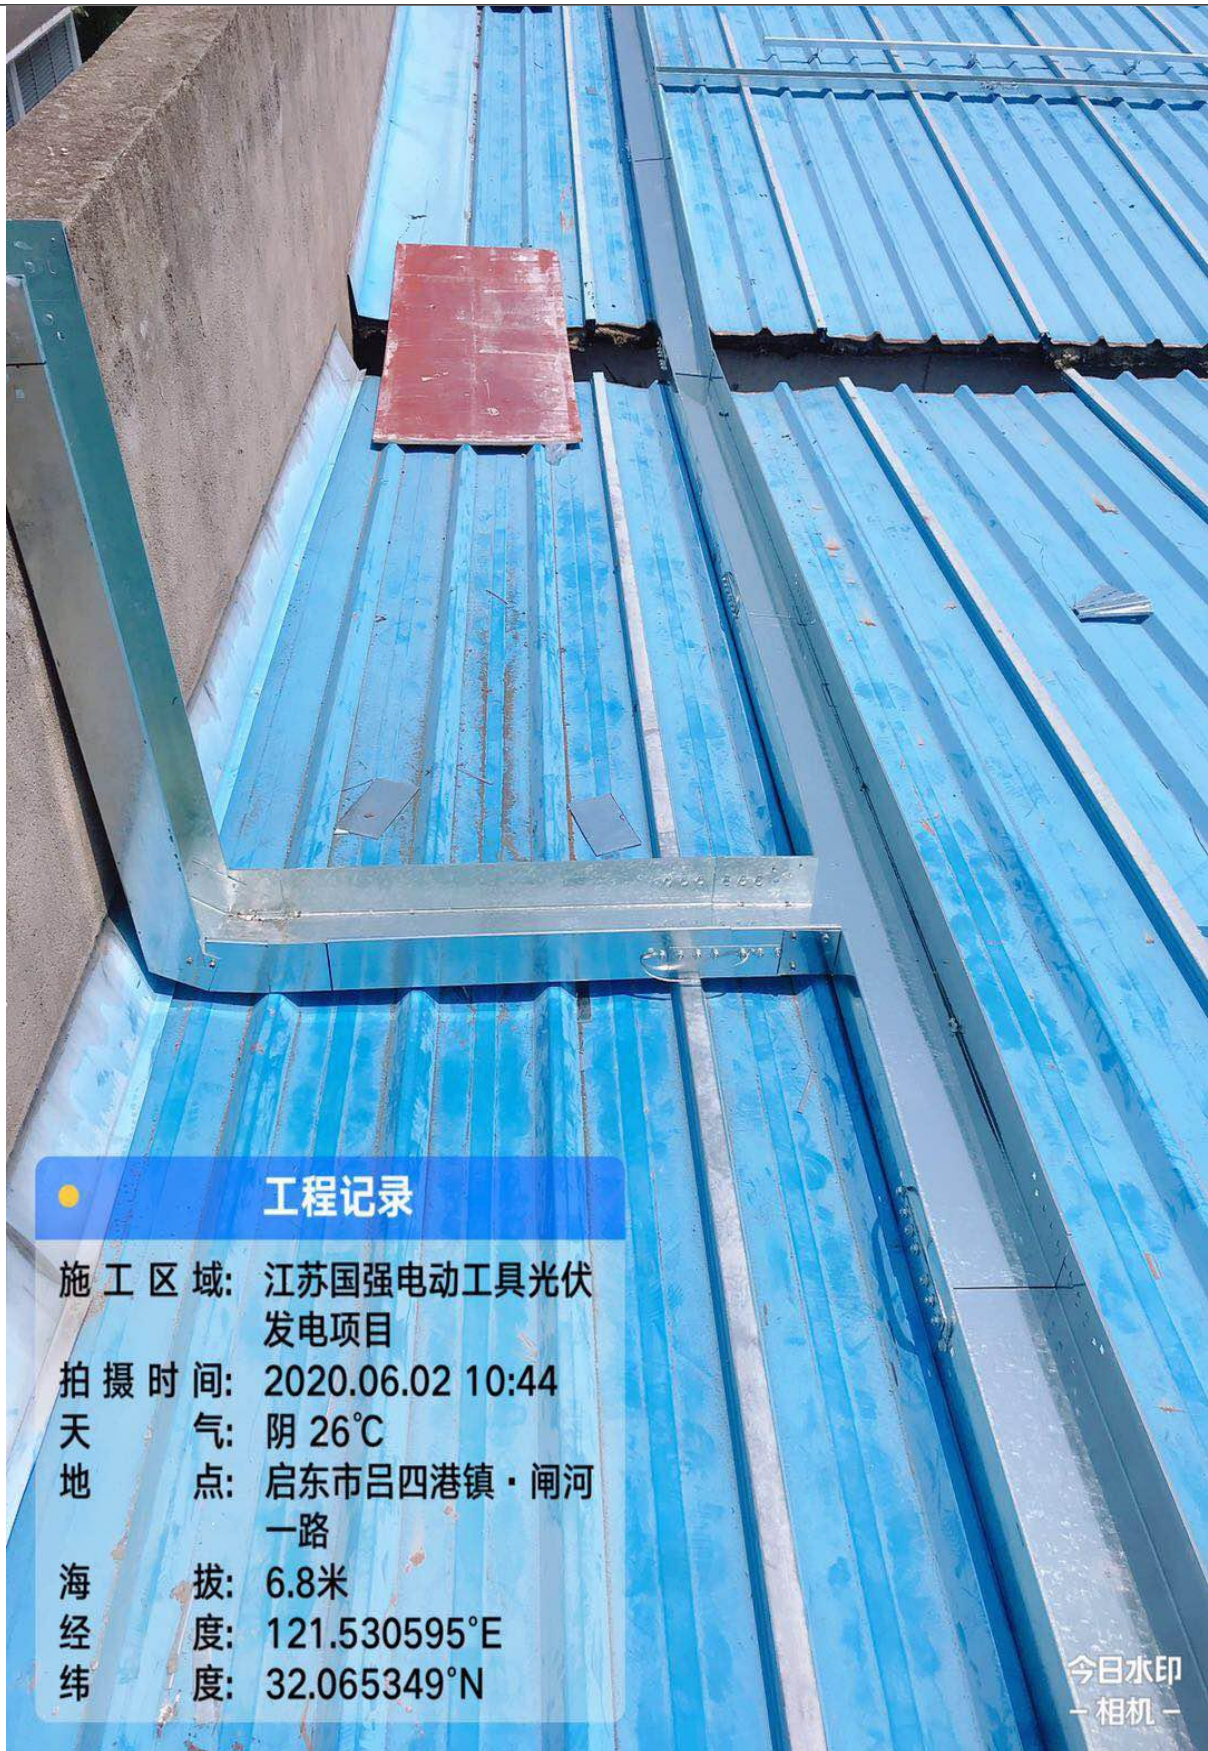

工程记录

施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目

拍摄时间: 2020.06.02 10:44

天气: 阴 26℃

地点: 启东市吕四港镇·闸河一路

海拔: 6.8米

经纬度: 121.530595°E

度: 32.065349°N

今日水印
- 相机 -

编写人

许青松

审核人

于彬

