

监理工程日报文字描述


工程名称: 江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 7 日	星期日	天气情况	晴	温度 20-28℃
施工部位	国强彩钢瓦屋面				
出勤人数	5 人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度 情 况	西区厂房夹具、轨道安装全部完成。 平顶屋面避雷扁铁焊接完成 90%。 西区厂房桥架铺设安装完成 60%			
	施工质量 情 况	符合设计要求。			
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	组件材料进场，汇流箱材料进场。			
	监理发出指 令情况	无			
	次日工作 安 排	桥架铺设安装，			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
填 报 人	许青松		审 核 人	于彬	

监理工程日报影像

工程名称：江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 7 日	星期日	天气情况	晴	温度 20-28℃
施工现场影像					
 工程记录 施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目 施工内容: 桥架固定 拍摄时间: 2020.06.07 15:31 天气: 多云 27℃ 地点: 南通市·江苏国强工具有限公司 海拔: 6.4米 经纬度: 121.530650°E 32.063044°N 今日水印 - 相机 -  工程记录 施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目 施工内容: 桥架固定 拍摄时间: 2020.06.07 15:32 天气: 多云 27℃ 地点: 南通市·江苏国强工具有限公司 海拔: 6.4米 经纬度: 121.530650°E 32.063044°N 今日水印 - 相机 -					

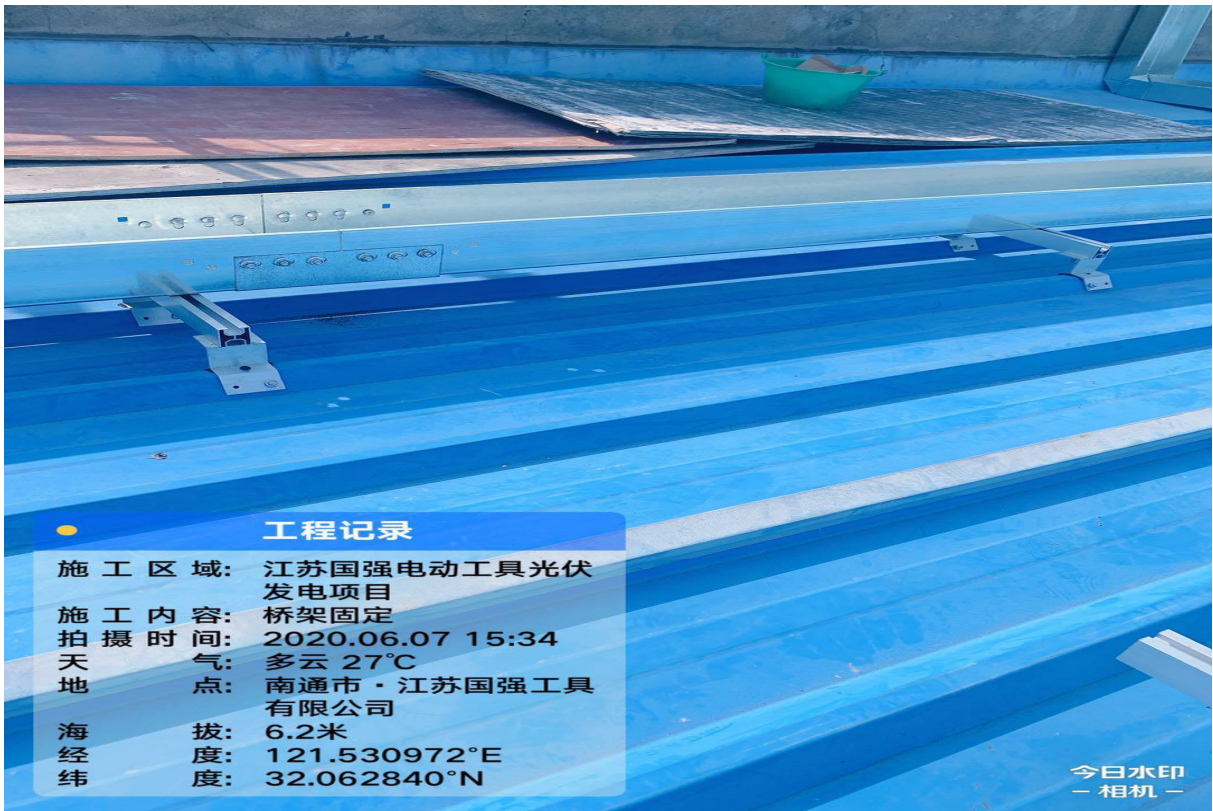

工程记录

施工区域: 江苏国强电动工具光伏
发电项目
施工内容: 桥架固定
拍摄时间: 2020.06.07 15:34
天气: 多云 27°C
地点: 南通市·江苏国强工具
有限公司
海拔: 6.2米
经纬度: 121.530972°E
32.062840°N

今日水印
- 相机 -

编写人

许青松

审核人

于彬
