


监理工程日报文字描述


工程名称：江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 9 日	星期二	天气情况	雨	温度 23-27℃
施工部位	国强彩钢瓦屋面				
出勤人数	10 人				
施工机械	吊车一台				
工作情况	施工进度 情 况	西区厂房夹具、轨道安装全部完成。 平顶屋面避雷扁铁焊接完成 90%。 西区厂房桥架铺设安装完成 60% 彩钢瓦 6、5 号厂房屋面组件吊装铺设完成，			
	施工质量 情 况	符合设计要求。			
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	组件材料进场，汇流箱材料进场。			
	监理发出指 令情况	无			
	次日工作 安 排	组件吊装铺设。			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
填 报 人	许青松		审 核 人	于彬	

监理工程日报影像

工程名称：江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

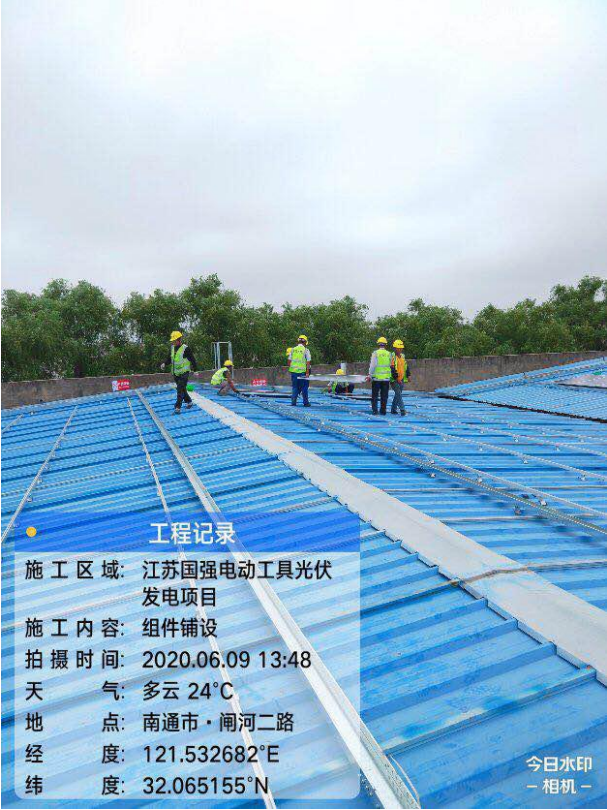日期	2020 年 6 月 9 日	星期二	天气情况	雨	温度 23-27 ℃
施工现场影像					
 工程记录 施工区域：江苏国强电动工具光伏发电项目 施工内容：组件铺设 拍摄时间：2020.06.09 13:48 天气：多云 24℃ 地点：南通市·闸河二路 经度：121.532682°E 纬度：32.065155°N 今日水印 - 相机 -  工程记录 施工区域：江苏国强电动工具光伏发电项目 施工内容：组件吊装 拍摄时间：2020.06.09 08:33 天气：阴 23℃ 地点：南通市·范公堤路 海拔：6.8米 经度：121.533458°E 纬度：32.065613°N 今日水印 - 相机 -					

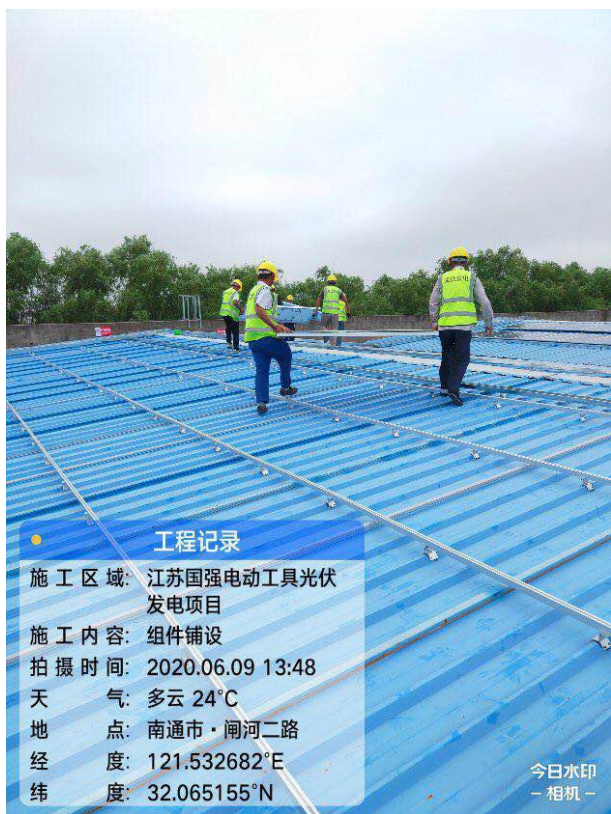

编写人

许青松

审核人

于彬

