

监理工程日报文字描述

工程名称：江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 10 日	星期三	天气情况	阴	温度 23-27℃
施工部位	国强彩钢瓦屋面				
出勤人数	10 人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度 情 况	平顶屋面避雷扁铁焊接完成 90%。 西区厂房桥架铺设安装完成 60% 彩钢瓦 6、5 号厂房屋面组件吊装铺设完成， 组件铺设安装 5%			
	施工质量 情 况	符合设计要求。			
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	组件材料进场，汇流箱材料进场，并网柜，室外箱。			
	监理发出指 令情况	无			
	次日工作 安 排	组件铺设安装			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
填 报 人	许青松		审 核 人	于彬	


监理工程日报影像

工程名称: 江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 10 日	星期三	天气情况	阴	温度 23-27 ℃
-----	-----------------	-----	------	---	---------------

施工现场影像



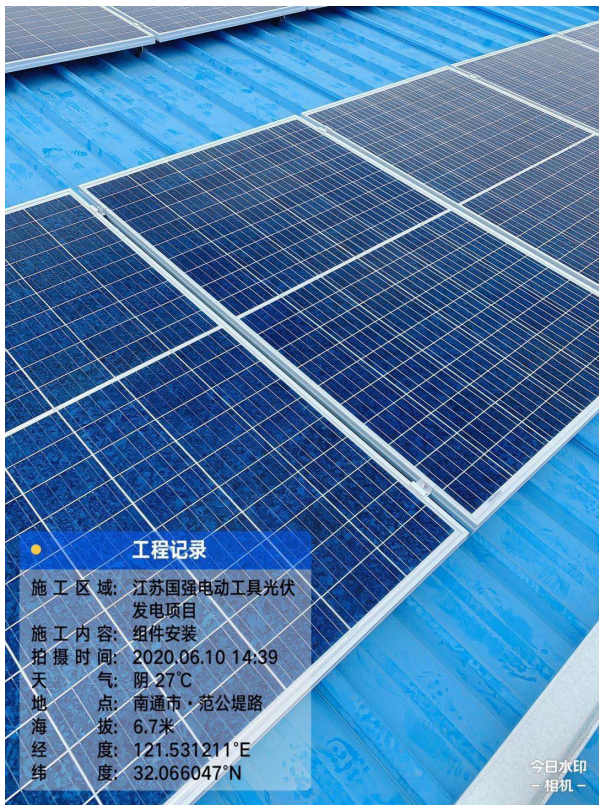

编写人

许青松

审核人

于彬

