

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 06 月 09 日 天气: 晴 星期: 三 气温: 24~28℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目


监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作。	
	2、安全施工情况: 安全基本正常, 无危险作业, 无登高作业。昨日一未点检登高车当日仍未点检, 安全检查不到位。	
	3、文明施工情况: 场地清洁;	
	4、钢构施工情况: 无施工;	
	5、电气施工情况: 西区设备围栏基础场地回填平整基本到位; 电缆防火封堵做法基本符合要求。	
	6、组件安装情况: 一区组件双螺栓加固完毕; 二区螺栓检查完毕。	
	7、电缆施工情况: 已结束。	
	8、安全(危险)因素: 无	
	9、施工危险点: 无	
	10、材料/设备到货情况: 围栏到货	
	11、材料/设备检查情况: 无。	
	12、施工总体进度情况: 一区双螺栓已加固完成, 二区检查紧固完成。	
	13、其它情况: 对大众 6 月 2 日二区场地验收提出的要求事项应及时完成并提交大众复查。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力发展有限公司	二区: 已完工。三区: 桩基一次浇筑完成 554 处, 钢结构立柱组立完成 76 根(共 732 处) 今日施工: 西区设备围栏基础土方回填平整。电缆防火封堵
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 4 人 明日工作: 西区设备围栏基础施工, 防火封堵。 其它方面: 大众技术部领导到场检查工作	
本 场 监 理 人 员		李 旭 远
记 录 人: 李 旭 远		总 监 理 工 程 师:

现场照片

1、场地平整情况



2、电缆头整改情况

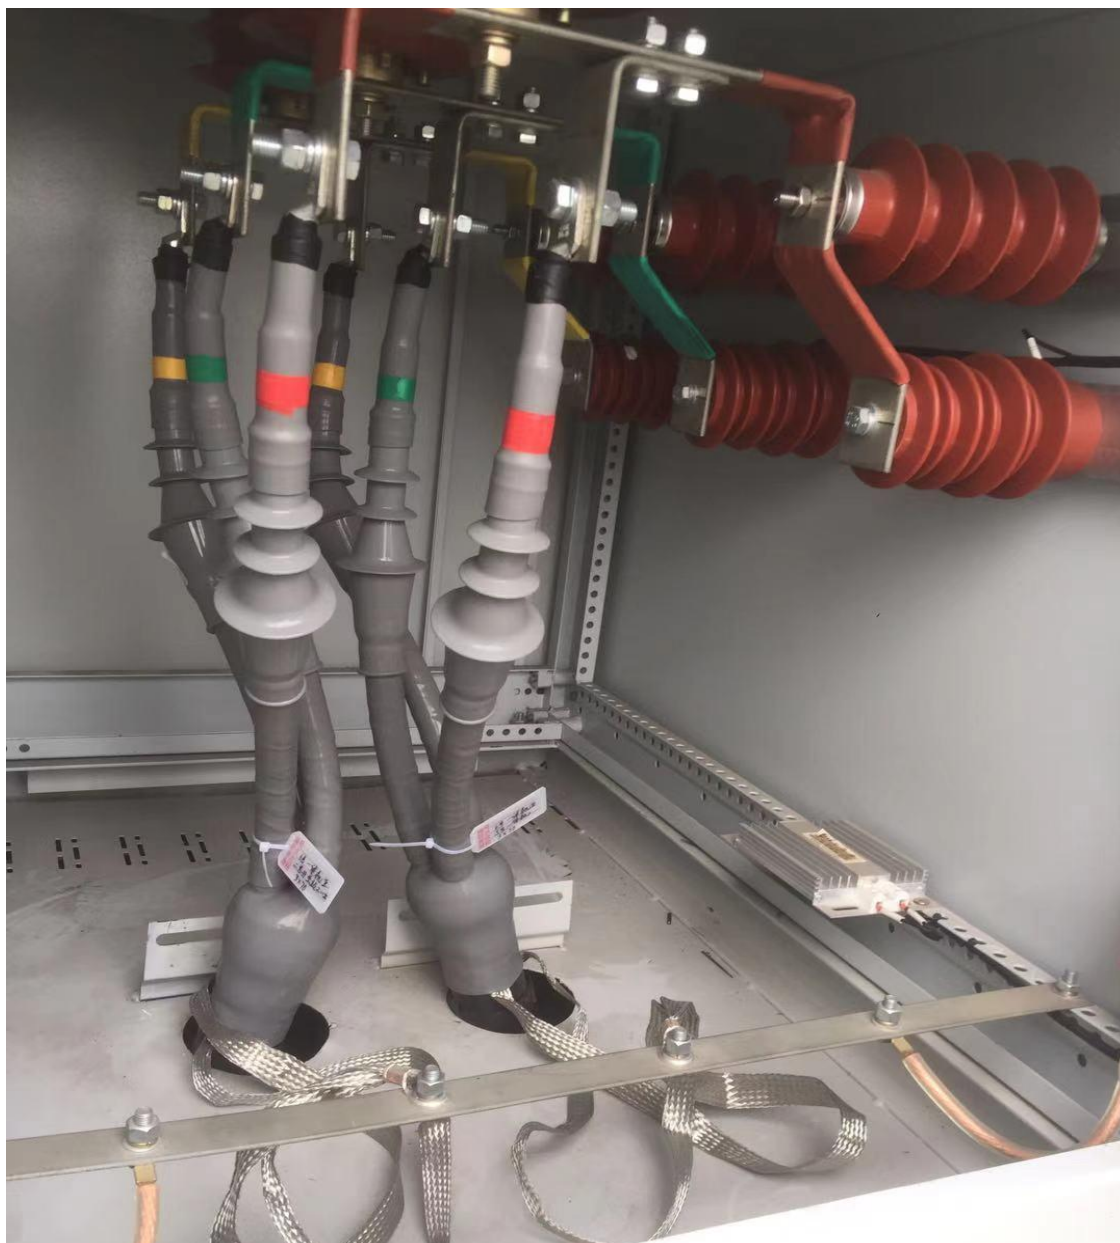

3、设备处场地平整



4、围栏到货

