

监 理 日 记 ()



日期: 2021年07月25日 天气: 大雨 星期: 日 气温: 25~27℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1、防台风值班

2、值班人员每两小时巡查一次, 现场钢结构、组件、电气设备、材料、临电等均正常。

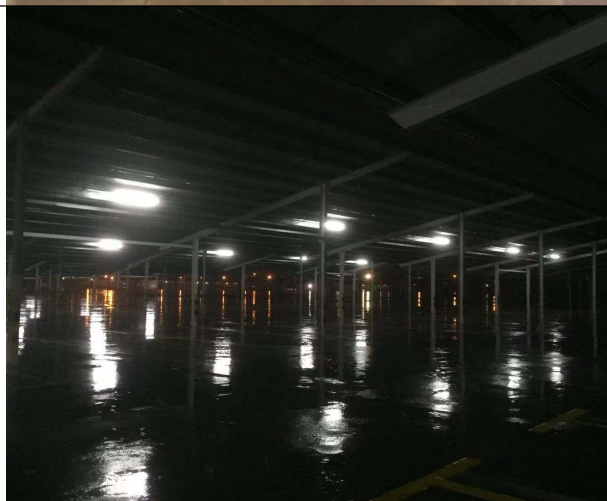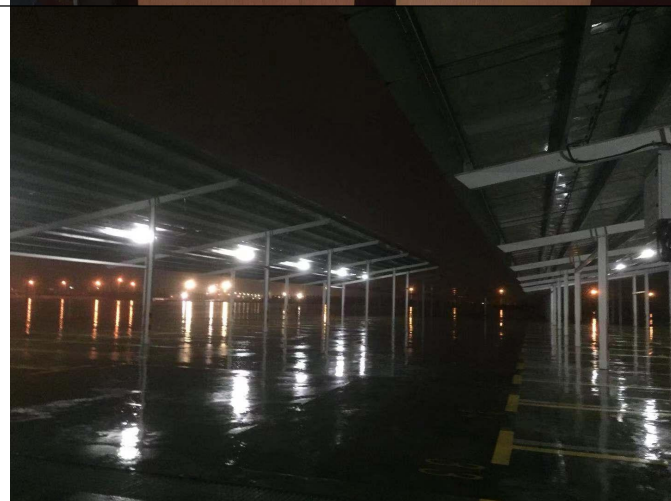

施 工 情 况	承包单位	浙江慈农电力发展有限公司	施工内容及进度
	三区进度完成情况: 檩条安装完成 14 个, 拉筋安装完成 10 个 (共 38 个); 组件安装完成 4.2 个车棚计 1940 块 (共 16905 块) 今日施工: 防台风值班。		
其它事项	管理及施工人员投入: 值班人员 12 人 机械设备投入: 无 明日工作: 暂无 (防台风值班) 其它方面: 无。		
本场监理人员		李长红	
记录人: 李长红		总监理工程师:	
