


监 理 日 记 ()

日期: 2021年07月30日 天气: 晴 星期: 五 气温: 25~32℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、督促检查班会落实</p> <p>2、高温安全施工情况: 无高温作业。</p> <p>3、安全文明施工情况: 点检正常, 临时用电、登高作业、劳保用品使用、监护及安全文明施工基本正常。</p> <p>4、钢构施工情况: 三列 14 排 51-56 车位柱子倾斜问题忆调整到位, 零星补漆。</p> <p>5、檩条安装情况: 檩条安装完成 2 个车棚, 拉筋安装 1.5 个车棚。</p> <p>6、电气施工情况: 无。</p> <p>7、组件安装情况: 组件铺装完成 0.6 个, 螺丝已加装, 但未紧固。</p> <p>8、电缆施工情况: 无。</p> <p>9、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击。</p> <p>10、施工危险点: 檩条安装、组件安装、钢结构调整及零星施工。</p> <p>11、存在问题:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) 三列 14 排 51-56 车位柱子倾斜。已整改。</p> <p style="padding-left: 40px;">2) 四列 12 排 71 车位下 6 排檩条托板螺丝未紧。未整改</p> <p style="padding-left: 40px;">3) 个别拉筋螺丝未拧紧(正在查找紧固)</p> <p>12、材料/设备到货情况: 无。</p> <p>13、材料/设备检查情况: 无。</p> <p>14、施工进度情况: 组件安装进展缓慢, 应增加安装班组, 把握利好天气, 抢抓进度。</p> <p>15、监理资料整理。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	<p>三区进度完成情况: 檩条安装完成 21.5 个, 拉筋安装完成 14 个(共 38 个); 组件安装完成 4.8 个车棚计 2217 块(共 16905 块)</p> <p>今日施工: 檩条安装, 组件安装、钢结构个别调整。</p>
其 它 事 项	<p>管理及施工人员投入: 安全员 1 人, 组件安装 5 人, 檩条安装 10 人, 钢结构 3 人</p> <p>机械设备投入: 登高作业车 5 台, 叉车 2 台, 手持式电钻 1 把</p> <p>明日工作: 檩条及拉筋安装、组件安装、钢结构个别调整</p> <p>其它方面: 无。</p>	
	本 场 监 理 人 员	
	记 录 人:	总 监 理 工 程 师:
		

现场照片


组件安装



组件铺装



檩条安装

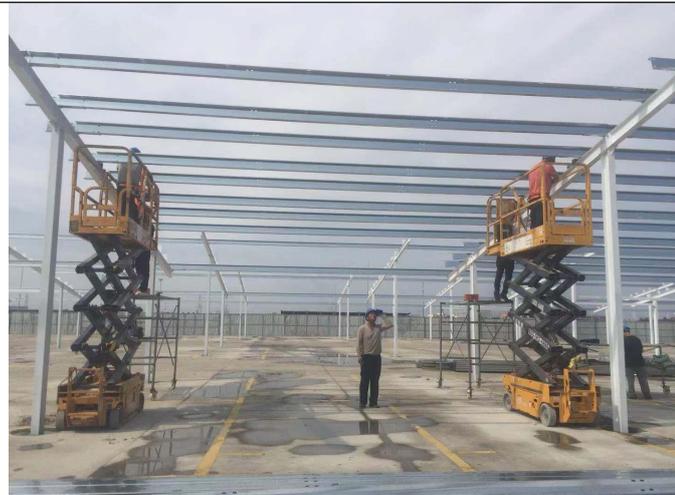

组件螺帽加装



组件检查



拉筋螺丝未拧到位

