

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 08 月 03 日 天气: 雷阵雨 星期: 三 气温: 26~30℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、督促落实班会及防疫工作 2、高温安全施工情况: 无高温作业。 3、安全文明施工情况: 车辆点检, 临时用电、登高作业、劳保用品使用、人员监护、文明施工基本正常。 4、钢构施工情况: 钢结构二次浇筑第 11 和 12 排, C30 商品混凝土 10m ³ 振捣密实, 表面收光到位。 5、檩条安装情况: 2*25 车位檩条安装完成, 2*23 车棚檩条安装完成 2 个车棚, 拉筋安装 1 个车棚。 6、电气施工情况: 无。 7、组件安装情况: 组件铺装完成 0.6 个车棚, 螺帽加装及紧固到位。 8、电缆施工情况: 电缆沟多余回土清理, 电缆路径计划测量。 9、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击、触电。 10、施工危险点: 檩条安装、组件安装、场地清理、二次浇筑振捣。 11、存在问题: 1) 地面电缆沟铺设后未及时浇筑, 形成很多条坑洞, 存在安全隐患 2) 个别二次浇筑人员未戴安全帽(已教育整改) 12、材料/设备到货情况: 组件到货三车, 3192 块, 总到货 12768 块(总 16905 块)。 13、材料/设备检查情况: 进场资料齐全, 外包装完好, 组件开箱抽查完好。 14、十一、十二排桩基二次浇筑旁站, 监理资料整理。	
施 工 情 况	承包单位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况: 檩条安装完成 30 个, 拉筋安装完成 19 个(共 38 个); 组件安装 7.6 个 车棚计 3511 块(共 16905 块) 今日施工: 檩条安装, 组件安装、桩基二次浇筑、电缆沟剩余回土清理。
其 它 事 项	管理及施工人员投入: 安全员 1 人, 组件安装 8 人, 檩条安装 10 人, 钢结构 8 人, 清理 3 人 机械设备投入: 登高作业车 5 台, 叉车 3 台 明日工作: 檩条及拉筋安装、组件安装、钢结构桩基孔内清理 其它方面: 无。	
本场监理人员		
记录人: 李太超		总监理工程师: 薛

现场照片


组件安装



檩条安装



钢结构基础二次浇筑

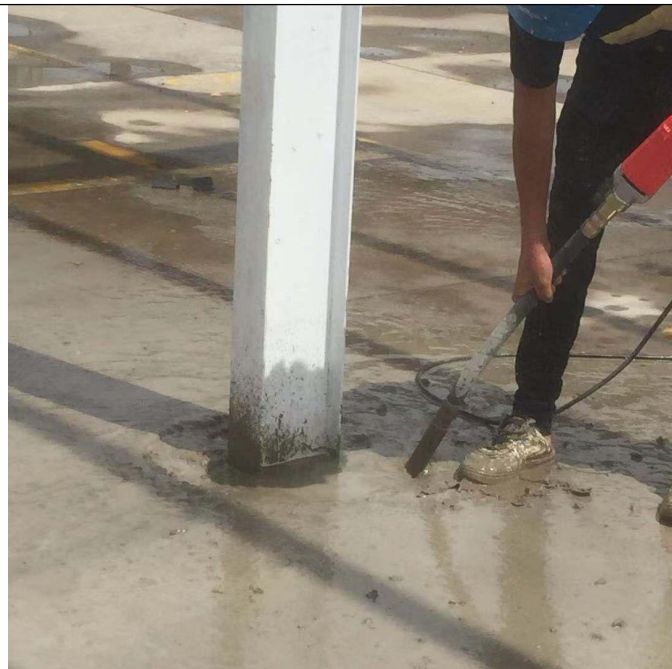

桩基表面收光



场地清理



电缆线路测量

