



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 08 月 18 日 天气: 晴 星期: 三 气温: 24~30℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、督促落实班会及防疫工作 2、高温安全施工情况: 无高温作业。 3、安全文明施工情况: 机械点检、登高作业、劳保用品使用、人员监护、文明施工基本正常。 4、电气施工情况: 无。 5、组件安装情况: 组件铺装完成 2.5 个车棚。 组件螺栓紧固力抽查, 符合厂家要求 (14~18N.m)。 6、电缆施工情况: 组件电缆穿线, 完成 2 个 2*25 车棚, 2 个 2*23 车棚。注意电缆放线不应生拉硬拽, 以防檩条损伤电缆外皮, 长期运行易造成绝缘下降。安排技术人员对电缆穿线进行检查, 以防穿线错误。 7、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击、触电、火险。 8、施工危险点: 组件安装、电缆敷设、作业车充电。 9、存在问题: 1) 场地垃圾应及时清理(正在清理); 2) 三区第二排组件螺丝有 8 处漏紧; 3) 组件放线过程中发现有外皮磨损情况。 10、材料/设备到货情况: 无。 11、材料/设备检查情况: 无。 12、资料整理	
施 工 情 况	承包单位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况(共 38 个车棚): 组件 33.5 车棚计 14868 块(共 16905 块); 汇流箱安装完成; 组件电缆放线完成 29 个车棚。 今日施工: 组件安装、组件电缆放线。
其 它 事 项	管理及施工人员投入: 安全员 1 人, 组件安装 11 人, 组件电缆敷设 3 人 机械设备投入: 登高作业车 5 台, 叉车 2 台, 电动扳手若干 明日工作: 组件安装、电缆敷设放线 其它方面: 无。	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师:

现场照片

组件电缆穿线




组件安装




组件校正调整



组件螺栓力矩检查

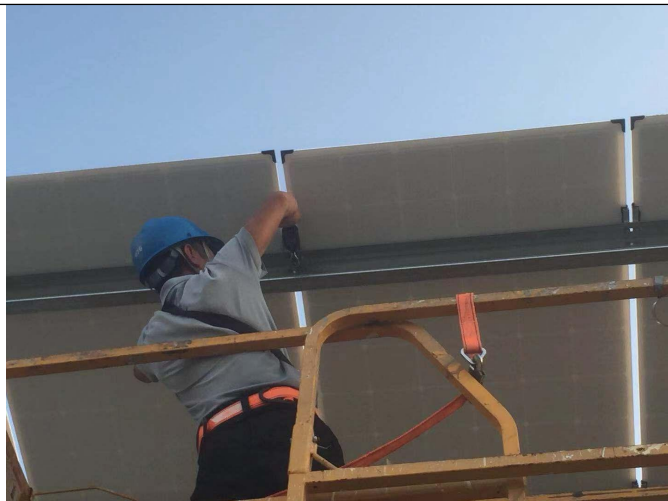

组件安装效果

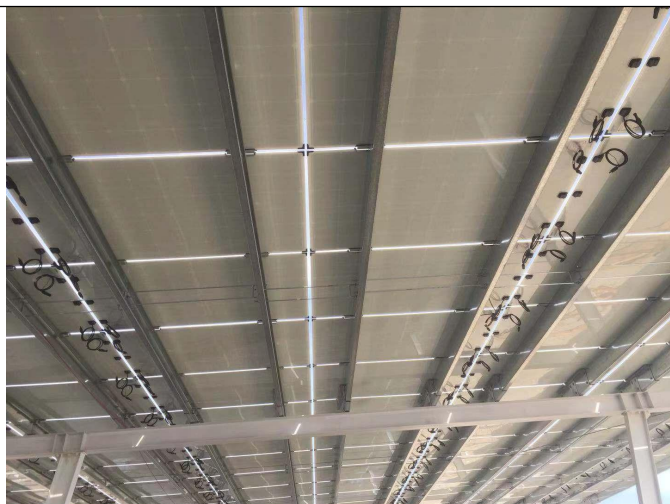

组件开箱检查

