



监 理 日 记 ()


日期: 2021 年 08 月 26 日 天气: 多云 星期: 四 气温: 25~32℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、督促落实班会及防疫工作 2、高温安全施工情况: 无高温作业。 3、安全文明施工情况: 机械点检、劳保用品使用、文明施工基本正常。 4、电气施工情况: 组件 MC4 插头制作。 5、钢结构施工情况: 已完工。 6、组件安装情况: 已完工。 7、电缆施工情况: 组件电缆穿线完成 3 个车棚, 今日全部穿线结束; 照明电缆穿线。 8、其它施工情况: 照明电缆管线安装。 9、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击。 10、施工危险点: 组件电缆敷设。 11、存在问题: 个别人员上登高作业未系安全带(已整改)。 12、材料/设备到货情况: 目前低压电缆未到货, 应尽快确认低压直流电缆到货情况。 13、材料/设备检查情况: 无。		
施 工 情 况	承包单位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况: 钢结构已完工, 组件已完工; 汇流箱安装已完工; 组件电缆放线已完工; 组件接线完成 10%, 照明施工完成 90%, 直流电缆敷设完成 0%, 直流电缆未到货。 今日施工: 组件电缆插接头制作, 组件电缆穿线, 照明管线安装, 电缆穿线。	
其 它 事 项	管理及施工人员投入: 电缆敷设 7 人 机械设备投入: 登高作业车 3 台, 叉车 1 台 明日工作: 组件电缆插接头制作安装, 照明安装 其它方面: 无。		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师:	

现场照片

MC4 接头制作

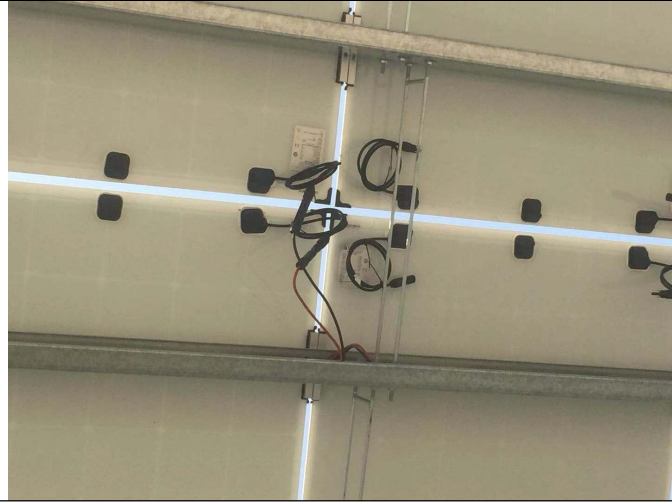

照明管线安装

