

监 理 日 记 ()


日期: 2021 年 09 月 02 日 天气: 晴转阵雨 星 期: 四 气 温: 24~34℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目


监 理 工 作 情 况	1、督促落实班会及防疫工作 2、高温安全施工情况: 高温作业, 按高温作息时间施工, 场地防暑降温用品配备齐全。 3、安全文明施工情况: 机械点检、劳保用品使用、文明施工基本正常。下午短时大风, 对围挡进行安全全检查, 发现 9 处斜撑螺丝断掉, 现场已及时更换。 4、电气施工情况: 无。 5、电缆施工情况: 汇流箱 1*4mm² 电缆压接 21 处、2*120mm² 直流电缆头制作安装 12 根, 组件 1*4mm² 电缆压接完成 35 车棚, 组件串接完成 7 车棚。照明电缆整理。制作安装工艺良好, 压接牢固和绝缘外皮破损。 6、其它施工情况: 钢结构问题整改修复, 柱修复基础表面养护, 防撞条安装完毕(反光贴粘贴 20 车棚)。 7、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击, 触电。 8、施工危险点: 电缆敷设, 登高作业组件电缆插接头制件。 9、存在问题: (1) 登高作业人员安全带系扣不规范, 已整改 (2) 个别人员安全帽未佩戴, 已整改 (3) 场地清理不到位。 10、材料/设备到货情况: 计划的今天 2*120 电缆未到货。 11、材料/设备检查情况: 无。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况: 钢结构安装已完工, 檩条安装已完工, 组件安装已完工; 汇流箱安装已完工; 组件及汇流箱电缆接线完成 36%; 照明施工完成 85%, 2*120 直流电缆敷设完成 34%。 今日施工: 1*4mm² 电缆压接, 2*120mm² 直流电缆头制作安装, 组件串接插接。照明电缆整理, 钢结构整改修复。
其 它 事 项	施工人员投入: 电气 14 人, 钢结构整改 6 人 机械设备投入: 登高作业车 3 台, 叉车 1 台 明日工作: 组件接头插接, 1*4mm² 电缆压接线, 反光贴粘贴, 钢结构整改修复。	
本 场 监 理 人 员	李 旭 远	
记 录 人: 李 旭 远	总 监 理 工 程 师: 陈 平	

现场照片

汇流箱 1*4mm² 电缆压接

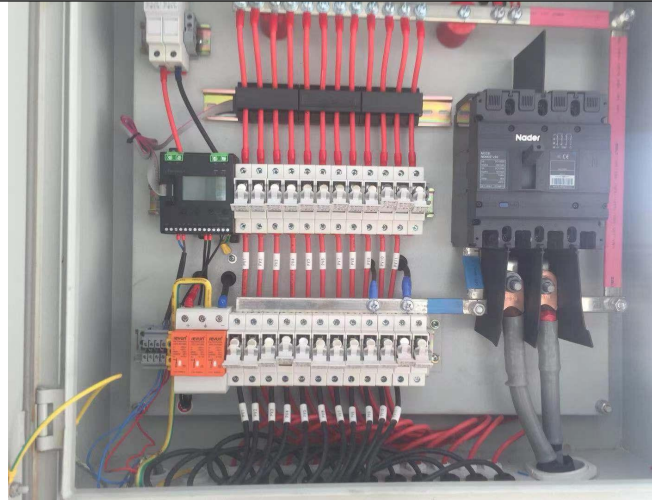


2*120 电缆头制作

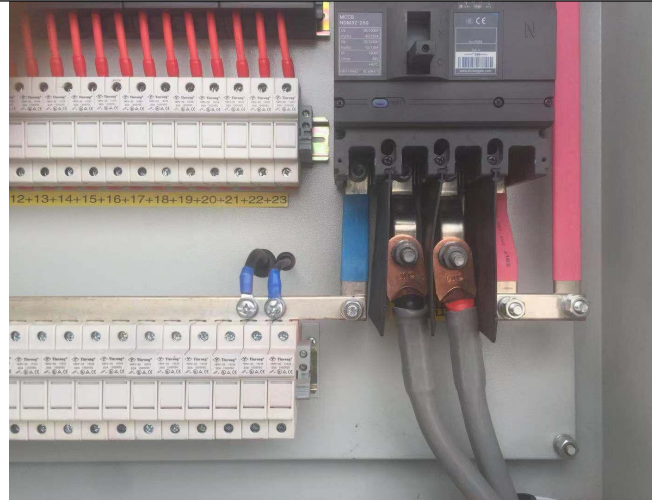

反光胶条粘贴



组件串接插接

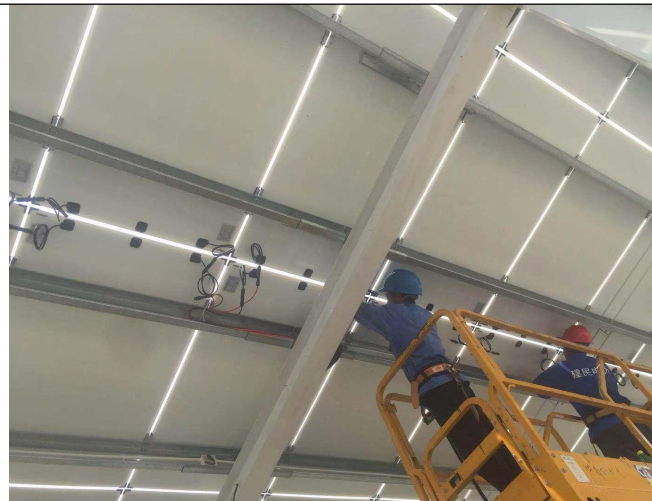

组件 1*4mm² 电缆接头制作



照明电缆敷设

