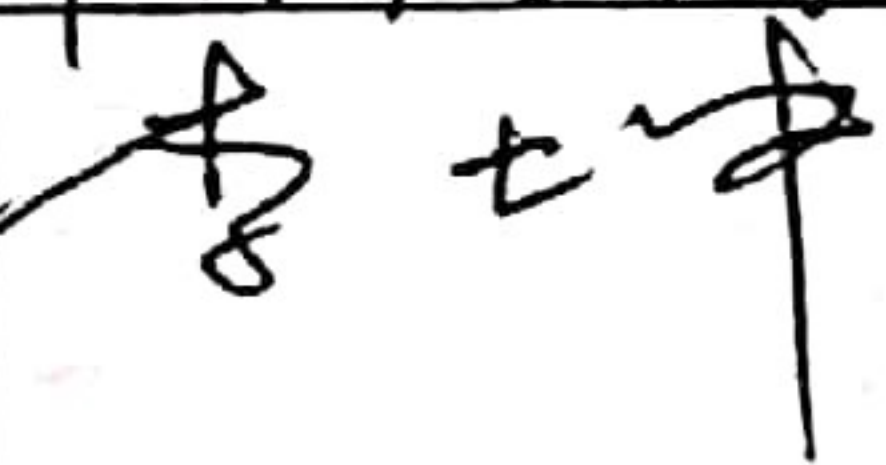


监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年 7月18日 星期: 二	天气: 白天: 夜间: 阴	气温: 最高 34℃ 最低 26℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日管桩到场6车 1. 4# 5# 6# 挖机打桩, 8# 9# 浮桥制作, 11# 陈支架整改, 14# 支架安装, 管桩头陈锈刷漆。 28# 29# 电缆沟开挖, 7# 箱变电缆沟开挖。 安装人员因昨晚下雨暂停施工。 机械吊车5台, 挖机3台, 浮桥7台, 发电机12台, 电焊机20台, 磨光机24台, 施工总人数120人。 2. 四方检查: 28# 29#、11# 10#、10#-7# 箱变电缆沟开挖, 检查开挖深度宽度是否符合要求, 现场要挖机加开。 3. 巡视施工班组8# 箱变陈桩放管桩复查, 清理整改, 部分管桩已运走。 4. 今天下午有国网领导来施工现场检查指导工作。			
记录人		总监签阅	
