

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 01 月 08 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	晴 2/-6℃
						人数	9 人
一、施工内容： 1. 5#、7#屋面夹具安装； 2. 屋面喷漆； 3. 逆变器支架安装。							
二、施工进度： 1. 1#、5#屋面导轨安装 100%； 2. 3#、5#、6#、7#屋面夹具安装 80%； 3. 桥架安装 60%。 4. 逆变器支架安装 50%							
三、施工质量问题： 1. 1#、5#屋面锈蚀严重，施工方今天进行喷漆处理。							
四、监理工作情况： 1. 检查施工通道、上下爬梯安全防护； 2. 要求施工方每天上班前对工人进行安全、技术交底并留下印象资料。 4. 组织召开监理例会和安全技术交底。							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	

六、现场照片：

图 1：早班会



图 2：屋面清理垃圾



图 3:逆变器支架制作

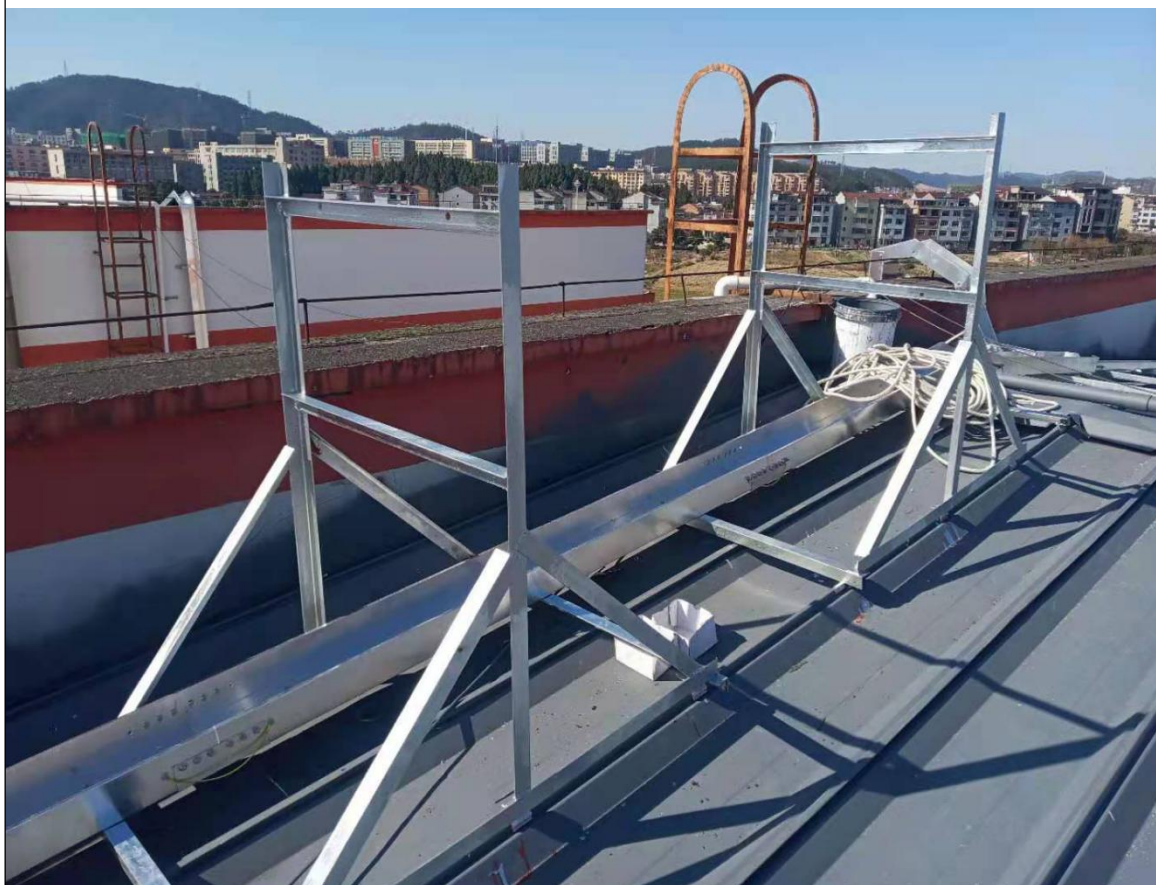


图 4: 铝导轨安装
