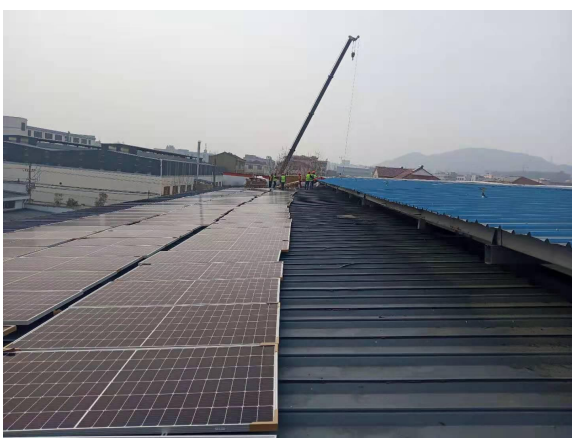


浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 01 月 16 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	多云 10/-1℃
						人数	14 人
一、施工内容： 1. 1#、2#、5#屋面组件吊装。 2. 并网柜就位。							
二、施工进度： 1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#屋面导轨安装 100%；8#屋面夹具、导轨安装 80%； 2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#屋面接地焊接 80%； 3. 桥架安装 80%； 4. 逆变器安装 100%； 5. 4² 直流电缆展放 60%。							
三、施工质量问题： 8#屋面夹具安装间距不符合要求，现场要求施工方整改后报验。							
四、监理工作情况： 1. 检查施工通道、上下爬梯安全防护措施落实情况，已完成 70%； 2. 接地扁铁焊接检查，部分未做防腐处理； 3. 现场组件吊装安全旁站。							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
				安徽辉能电力工程有限公 司			

六．现场图片	
图 1：组件倒运、吊装	图 2：组件吊装
	
图 3：组件分散	图 4:组件分散
	
