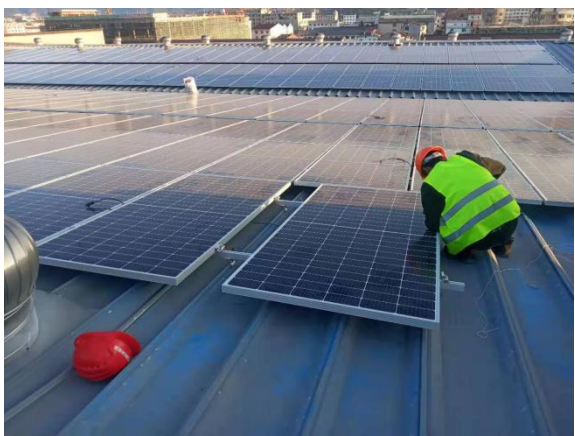


浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 01 月 21 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	多云 23/10℃
						人数	14 人
一、施工内容： 1. 1#、8#屋面组件安装； 2. 8#屋面接地焊接。							
二、施工进度： 1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面导轨安装 100%； 2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面组件安装 90%； 3. 桥架安装 90%； 4. 逆变器安装 100%； 5. 4² 直流电缆展放 70%。							
三、施工质量问题： 1. 8#屋面局部夹具、导轨安装不符合要求，现场要求施工方整改后报验； 2. 接地焊接局部不符合要求。							
四、监理工作情况： 1. 检查施工通道、上下爬梯安全防护措施落实情况，已完成 70%； 2. 接地扁铁焊接检查，部分未做防腐处理； 3. 屋面组件安装检查；							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
				安徽辉能电力工程有限公 司			

六．现场图片	
图 1：组件安装	图 2：组件安装
	
图 3：接地焊接	图 4:直流电缆展放
	
