

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 01 月 25 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	多云 18/5℃
						人数	8 人
一、施工内容： 1. 3*70 电缆敷设，4 平方电缆展放； 2. 接地焊接；							
二、施工进度： 1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面导轨安装 100%； 2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面组件安装 100%； 3. 桥架安装 90%； 4. 逆变器安装 100%； 5. 4² 直流电缆展放 70%。							
三、施工质量问题： 1. 接地焊接搭接面、防腐不符合要求，需整改； 2. 电缆敷设不符合要求，局部未绑扎。							
四、监理工作情况： 1. 现场检查 3*70 电缆敷设，4 平方电缆展放； 2. 现场巡查环网接地焊接。							
五、整改通知单及整改情况：8#屋面逆变器支架整改中							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
				安徽辉能电力工程有限公司			
六．现场图片							

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

图 1：电缆展放



图 2：电缆展放



图 3：接地焊接

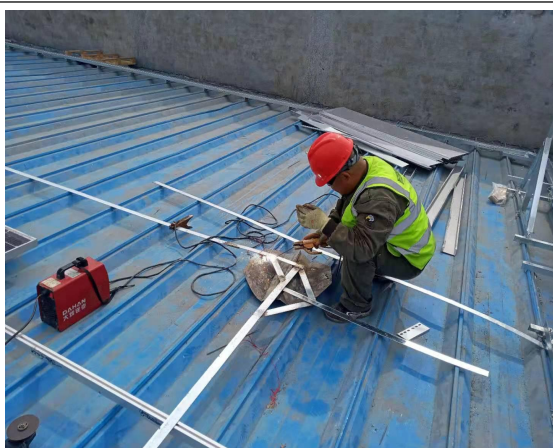


图 4：接地焊接

