

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

| | | | | | | | |
|---|---------------------|----------|-----|------------------|--------------|------|------------|
| 日期 | 2021 年 01 月 31 日 | 监理 人员 | 刘德文 | 地点 | 天喜股份 有限公司 | 天气 | 晴 19/9℃ |
| | | | | | | 人数 | 7 人 |
| <p>一、施工内容：</p> <p>1. 8#屋面直流电缆展放；</p> <p>2. 逆变器接线，交流电缆终端制作。</p> | | | | | | | |
| <p>二、施工进度：</p> <p>1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面导轨安装 100%；</p> <p>2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面组件安装 100%；</p> <p>3. 桥架安装 100%；</p> <p>4. 逆变器安装 100%；</p> <p>5. 4² 直流电缆展放 90%，交流电缆展放 100%。</p> | | | | | | | |
| <p>三、施工质量问题：</p> <p>1. 现场直流电缆绑扎、穿管不符合规范要求，要求施工人员进行整改。</p> | | | | | | | |
| <p>四、监理工作情况：</p> <p>1. 检查 8#屋面直流电缆展放、电缆穿管敷设。</p> <p>2. 检查交流电缆终端制作，逆变器接线。</p> | | | | | | | |
| <p>五、整改通知单及整改情况：</p> | | | | | | | |
| 文件编号 | 文件标题 | | | 接收单位 | | 是否回复 | |
| | | | | 安徽辉能电力工程有限公 司 | | | |
| 六. 现场图片 | | | | | | | |

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

图 1：逆变器安装



图 2：逆变器安装

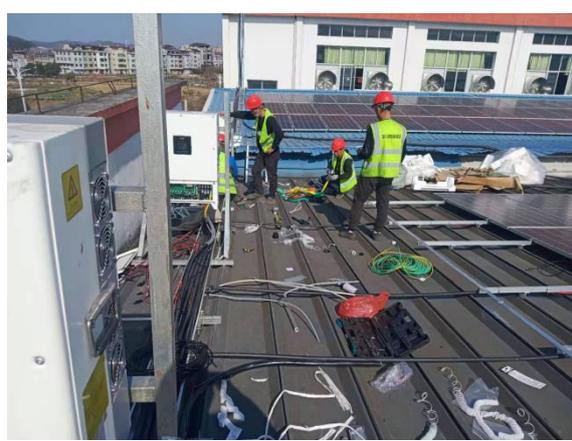


图 3：逆变器安装



图 4：电缆穿管敷设

