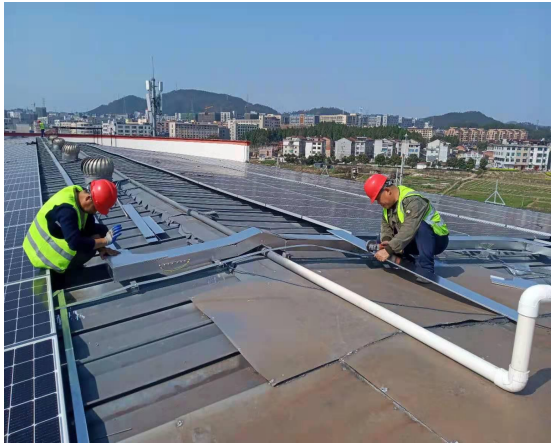
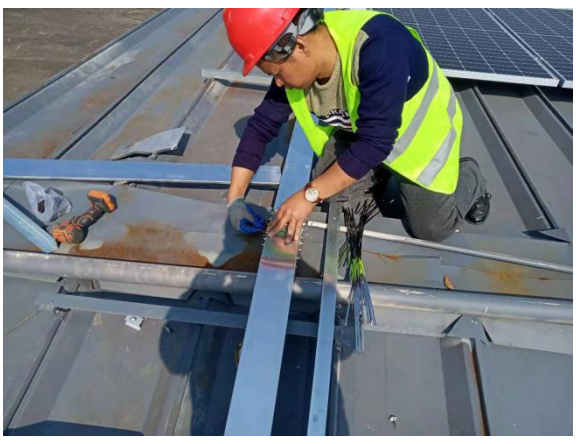


浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 02 月 24 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	晴 22/10℃
						人数	6 人
一、施工内容： 1. 现场电缆桥架盖板； 2. 组串故障检查。							
二、施工进度： 1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面导轨安装 100%； 2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面组件安装 100%； 3. 桥架安装 100%； 4. 逆变器安装 100%； 5. 4² 直流电缆展放 100%，交流电缆展放 100%。							
三、施工质量问题： 1. 现场接地扁铁焊接不全，局部未固定； 2. 现场电缆敷设不规范，局部直流电缆未穿管。							
四、监理工作情况： 1. 电缆桥架盖板前检查； 2. 下发监理工作联系单，要求施工方隐蔽工程自检合格后报验。							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
TXCD-JLTZ -003	监理工作联系单			安徽辉能电力工程有限公 司		否	
六．现场图片							

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

图 1：屋面电缆桥架盖板	图 2：屋面电缆桥架盖板
	
图 3：组串检查	图 4：组串检查
	
