

正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 11 月 04 日 星期四 阴 13-22℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1 人，安全员 1 人，施工人员 14 人，叉车 1 台，50T 吊车 1 台

三、现场安全、质量情况

1. 现场安全状况基本良好，手续齐全，措施到位，早班会交底到位，劳保用品到位，过程正常；
2. 场地垃圾清理到位，临时用电已切除；
3. 配重块底部防水卷材已按设计要求铺设；
4. 炮楼吊装及施工安全正常；
5. 大配重块屋面倒运方法已落实，方法得当，安全可靠；
6. 配重块吊装倒运过程成品保护基本正常。

四、实际进度与计划进度对比分析；


1. 综合制剂车间屋面光伏组件支架配重块吊装完成 80%；
2. 抗肿瘤车间放线完成约 95%；
3. 屋面组件支架材料开始分配；
4. 农垦公司领导到项目现场视察。

工程形象照片

1、江苏农垦公司领导工作视察



2、江苏农垦公司领导工作视察

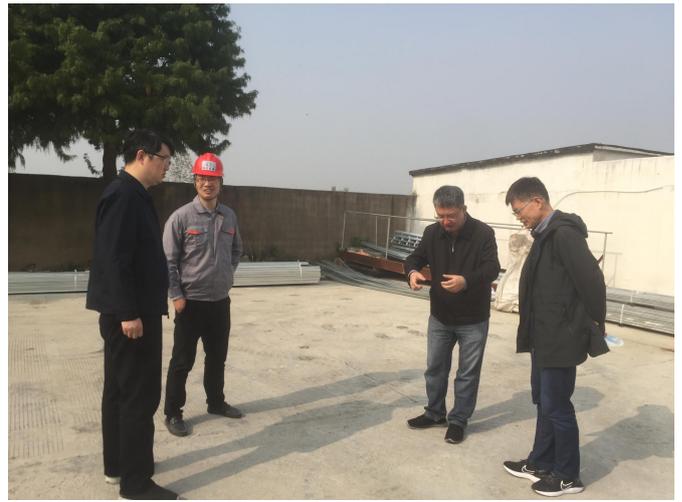


3、配重块屋面倒运



4、屋面组件支架配料



5、支架材料尺寸检查

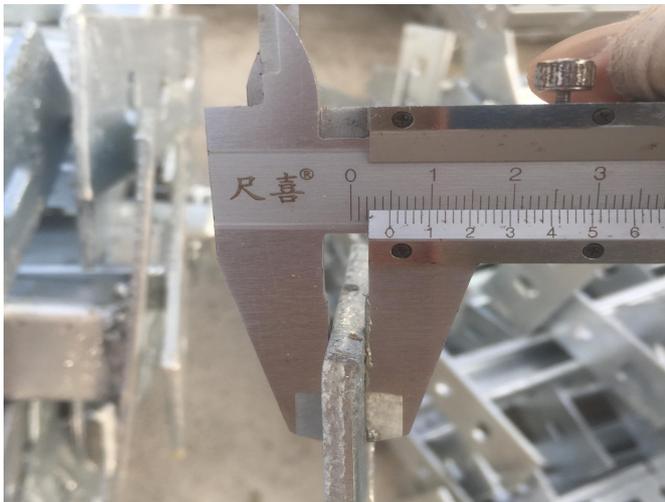

6、支架材料镀锌层检查

