

正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 11 月 09 日 星期二 多云 1~11℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1 人，安全员 1 人，施工人员 18 人，叉车 1 台，50T 吊车 1 台

三、现场安全、质量情况

1. 现场安全无异常：手续齐全、措施到位、落实早班会。
2. 今日危险点：吊装作业、支架安装、配重块就位；
3. 可能危及伤害：高处坠落、落物伤人、机械伤害、物体打击；
4. 生活服务楼及肿瘤车间屋面两处爬梯已安装防坠；
5. 垃圾当天应及时清理干净；
6. 部分支架安装问题要尽快整改到位，支架安装须通过验收后组件方可进入下一道工序；
7. 组件未经业主或监理在场私拆箱；
8. 生活服务楼组件试装，组件边缘距檩条边缘 35mm；
9. 组件安装时应注意轻拿轻放，搬运时不得从组件上拖拽，不得划伤组件表面，不得用硬物重压组件，不得踩踏组件，注意成品保护；
10. 每日安装的组件必须固定牢固，且未安装的组件应固定稳妥；
11. 总包单位应加强对施工作业班组质量意识教育，严格按图施工。

四、实际进度与计划进度对比分析：

厂房名称 (容量)		综合制剂车间 (340.2kW)	肿瘤车间 (359.64kW)	生活服务楼 (116.64kW)	一期增补 (29.16kW)
已用天数 (d)		8	1	1.5	0
已完 成量 (%)	配重块就位	100	40	100	0
	支架安装	70	0	90	0
	组件安装	0	0	1.0	0
	电缆敷设	0	0	0	0


注：实际进度滞后。应适当增加作业班组和适当赶工措施。

工程形象照片

1、生活服务楼支架安装



2、配重块吊装就位

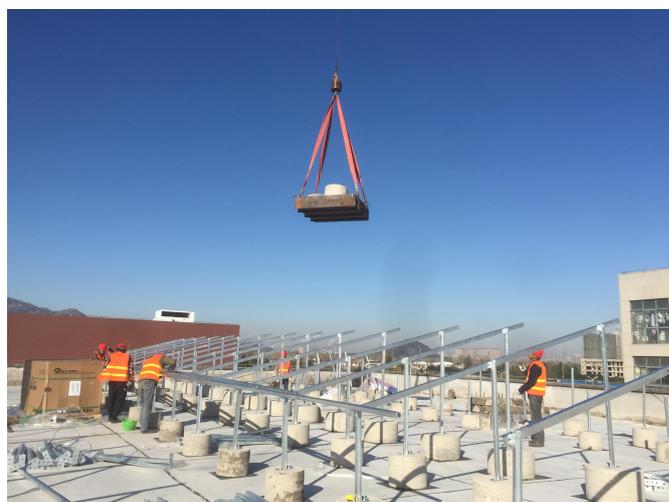

3、支架安装检查



4、爬梯已安装防坠器和警示标识



5、组件试装



6、组件与檩条边缘距离



7、场地垃圾收集不善飘落致地面



8、施工材料散落凌乱



9、斜梁弯曲



10、檩条弯曲、起伏不平



11、支架前后间距不一，防水贴偏离



12、螺栓未拧紧或无螺帽

