

监理日报

2021年11月11日 星期四 晴 3-14℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二十、现场施工情况

1、围挡拆除工作已完成，累计拆除 1664 米，累计完成 100%；

2、支架基础开孔、螺丝安装，今日支架基础螺栓安装完成 10 组，累计完成 37 组，设计量 58 组，累计完成 63.8%；

3、光伏组件倒运完成 100%；

4、今日分解围栏工作正式施工，拆除彩钢瓦、分解立柱约 232 米，累计完成 13.9%；

施工人员 4 人，分包管理人员 2 人，总包管理人员 3 人；机械设备：叉车 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：今日开始围栏分解工作，现场核查进场人员安全码、行程码以及疫苗接种情况，对进场人员进行安全技术交底，交底内容包括防割、物体打击、气罐使用注意事项以及安全距离等，新进场施工人员未佩戴反光服，已要求现场整改；

质量：检查地脚螺栓埋深是否达到要求，要求总包方提供化学螺栓使用寿命证明文件以及最终版图纸，计划明日对地脚螺栓进行拉拔试验，每根螺栓需达到设计要求的抗拉拔力 2KN；

二十一、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与总包报审的计划进度对比相对滞后；

围栏倒运堆码



安全技术交底




地脚螺栓安装位置开孔



安装孔清理



地脚螺栓安装

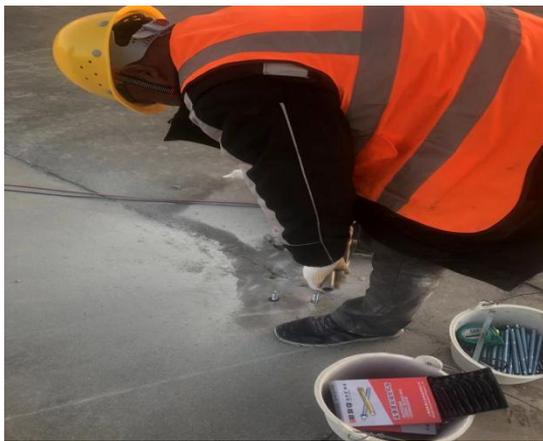

施工人员未穿反光服

