

# 监理日报

2021年11月23日 星期二 晴 -2-9℃

## 一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 二、现场施工情况

1、接地极安装完成 85%；接地扁钢焊接完成 320 米，累计完成 76.2%；

2、电缆保护管拖拉完成 8 根 DN110+2 根 DN40；

3、1\*4 mm<sup>2</sup> 线到场 10000 米，485 线到场 2800 米；已卸车完成；

施工人员 5 人，分包管理人员 1 人，总包管理人员 3 人；机械设备：水平定向钻机 1 台、叉车 1 台；

## 三、现场安全、质量情况

安全：参加项目部组织的安全技术交底，旁站电缆盘卸车，旁站时发现施工人员未佩戴安全帽及反光服，已现场整改；焊接作业时，焊机周围未配备灭火器等消防设施，已要求整改；

质量：查看现场接地极安装情况，检查接地扁钢焊接搭接长度以及搭接面积，符合要求，现场要求清理焊接处焊渣，涂刷底漆，底漆涂刷完成后刷防腐漆；检查到场线缆合格证以及检测报告，外观良好，合格；电缆保护管已基本拖拉完成，明日进行试穿，查看管道是否通畅；

## 四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与总包报审的计划进度对比相对滞后；

电缆到场卸车	电缆保护管拖拉
	

接地扁钢焊接敷设



焊接处焊渣清理




接地环网与接地极焊接



接地极焊接后就位



485 线合格证

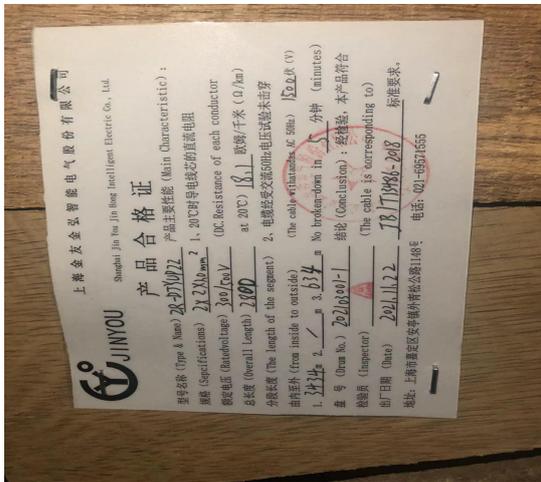

直流电缆合格证

