

监理日报

2021 年 11 月 25 日 星期四 晴 2-16℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、光伏支架今日全部到场，卸车完成；

2、光伏支架试安装，暂时未出现异常情况；

施工人员 5 人，分包管理人员 1 人，总包管理人员 3 人；机械设备：叉车 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部组织对施工人员进行安全技术交底，对光伏支架卸车进行安全旁站，施工人员安全用品佩戴齐全，目前安全状况良好；

质量：厂区原有电缆沟盖板因施工设备造成损坏，需更换；检查到场光伏支架规格型号、镀锌层厚度，符合图纸设计要求；

四、实际进度与计划进度对比分析

项目部已重新编制施工进度计划以及材料进场计划，目前实际进度与计划进度相符；明日增加进场施工人员；


光伏支架试安装	支架合格证
	
檩条镀锌层厚度检测	檩条规格测量




进场支架检查



立柱规格测量

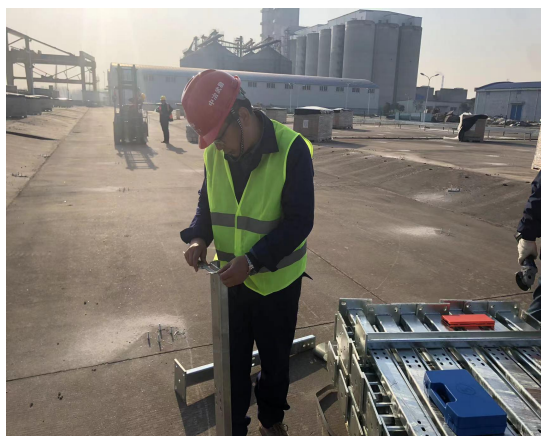

立柱镀锌层测量

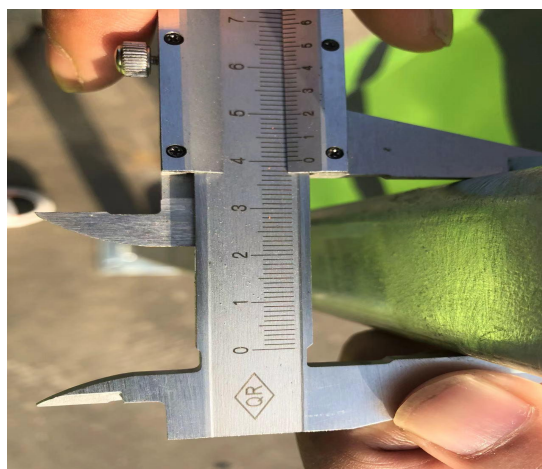

电缆沟盖板损坏

