

监理日报

2021年11月29日 星期一 多云 9-18℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

- 1、光伏支架今日安装完成 100%；
- 2、并网柜安装完成 2 台，累计完成 100%；
- 3、1#电缆井砌筑完成 100%；
- 4、光伏组件安装完成 200 块，累计安装 300 块，累计完成 16.5%；
- 5、直流电缆敷设 1500 米，累计完成 29%

施工人员 18 人，分包管理人员 2 人，总包管理人员 2 人；机械设备：叉车 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：检查现场施工人员安全用品佩戴情况，收到厂区通知，码头旁边厕所内严禁吸烟，已要求项目部对分包进行通知，以后发现将按照项目安全生产奖惩考核制度考核；光伏组件安装时后立柱较高，组件搬运时较为困难，具有较大的安全隐患，要求项目部组织安全技术交底，指出项目施工风险点，保证施工人员安全；

质量：检查光伏组件安装质量，由于支架安装时檩条未进行调整，导致组件安装后压块上下起伏，影响观感质量，已要求现场安装组件前将檩条调整到位；正在安装的个别阵列上下排组件错边量较大，已要求现场整改；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与计划进度相符；支架已全部安装完毕，明日人员主要安装光伏组件；


并网柜安装就位	母排厂家到现场测量尺寸
---------	-------------



光伏组件安装



1#电缆井砌筑

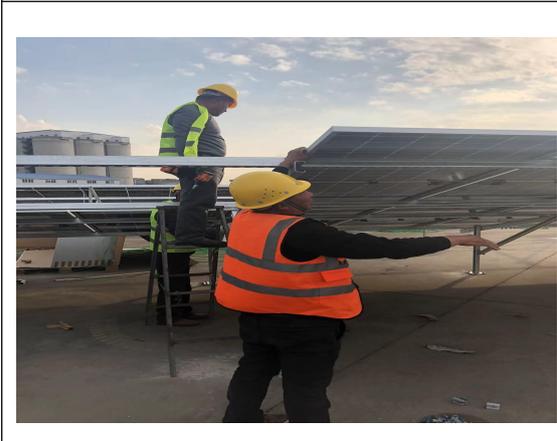

光伏支架安装



交流电缆套管敷设

