

监理日报

2021 年 11 月 30 日 星期二 多云 2-11℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、组件间 MC4 插头连接捆扎 30%；

2、汇流柜安装完成 2 台，累计完成 100%；

3、光伏组件安装完成 1100 块，累计安装 1400 块，累计完成 77.78%；

4、直流电缆敷设 7500 米，累计敷设 9000 米，累计完成 90%

施工人员 16 人，分包管理人员 2 人，总包管理人员 2 人；机械设备：叉车 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：今日大风天气，施工环境较为恶劣，对组件搬运、安装影响很大，施工时造成 7 块组件损坏，总包单位已联系组件厂家补发，现场组织安全技术交底，检查施工人员安全防护用品佩戴情况，目前安全状况良好；

质量：检查光伏组件安装质量，个别阵列组件中边压缝隙不符合要求，组件安装后边压距离支架边缘较近，容易滑脱；现场光伏组件搬运时有单人背板现象，已现场要求整改，并签发监理通知单 005 要求整改相关质量问题，今日开箱发现 1 块组件损坏，非人为原因，已联系厂家说明；


四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与计划进度相符；计划明日光伏组件安装完毕；

桥架与电缆井连接	光伏组件安装
----------	--------



召开监理会议

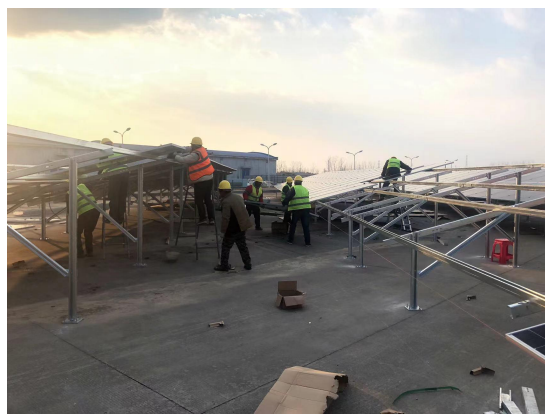


汇流箱安装



光伏组件安装



组件间 MC4 插头连接

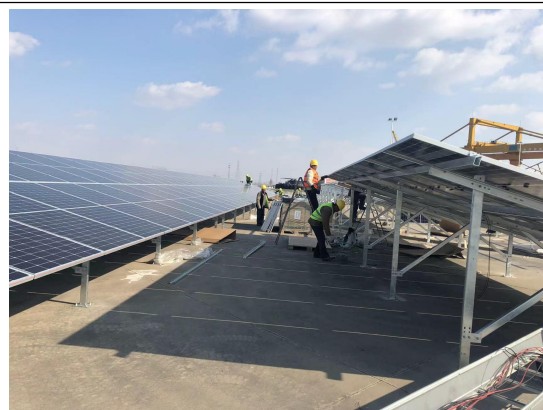

边压距离支架边缘较近



中边压缝隙不符合要求

