

# 监理日报

2021年12月09日 星期四 多云 5-16℃

## 一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 二、现场施工情况

1、支架地脚螺栓浇筑混凝土保护层 50%；

2、组件间接地线安装 100%；

3、组串线开路电压测量完成 100%；

施工人员 4 人，分包管理人员 2 人，总包管理人员 3 人；机械设备：叉车 1 台；

## 三、现场安全、质量情况


安全：项目部组织对组串开路电压测量以及混凝土保护层浇筑施工人员安全技术交底，检查现场施工人员安全帽以及反光服佩戴情况，目前安全状况良好；

质量：支架地脚螺栓逐个检查验收，目前已验收约 80%，截止到目前发现脱落松动的地脚螺栓已全部使用记号笔标注在立柱，要求施工人员整改，整改完成后复验合格，才能浇筑混凝土保护层。旁站组串线开路电压测量，发现有 3 组组串无电压，其余组串电压正常，无电压组串已整改完成，组串线已全部接到逆变器；

## 四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与计划进度相符；明日计划焊接接地环网，设备接地连接；

地脚螺栓检查验收	组串跳线捆扎
----------	--------

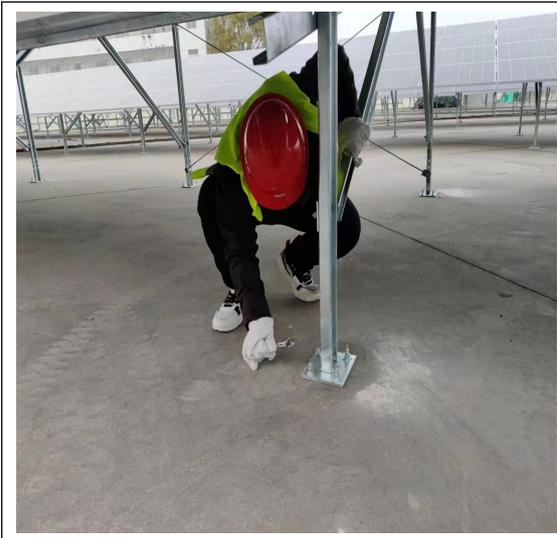

组串线已接到逆变器



组串开路电压测量



组串开路电压测量



光伏区现状

