

监理日报

2021 年 12 月 11 日 星期六 多云 4-13℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、支架地脚螺栓浇筑混凝土保护层 75%；

2、逆变器、并网柜防火封堵完成 100%；

3、电缆挂牌、组串标示粘贴完成；

4、逆变器、并网柜、汇流柜标识牌粘贴完成；

施工人员 4 人，分包管理人员 2 人，总包管理人员 3 人；机械设备：叉车 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部组织对混凝土保护层浇筑施工人员安全技术交底，检查现场施工人员安全帽以及反光服佩戴情况，目前安全状况良好；

质量：损坏的地脚螺栓未经验收隐蔽完成，现场整改，抽查已隐蔽的地脚螺栓，砸开混凝土保护层检查，检查结果良好，再次通知项目部，地脚螺栓整改后未验收严禁隐蔽；电缆桥架封盖前必须将转角处做好防护，检查合格后才能盖板；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与计划进度相符；

未经验收的地脚螺栓砸开混凝土保护层检查	未经验收的地脚螺栓砸开混凝土保护层检查
---------------------	---------------------



逆变器标识安装



并网柜标识安装




组串标识粘贴



热缩套管破损需修补




电缆转角处防护

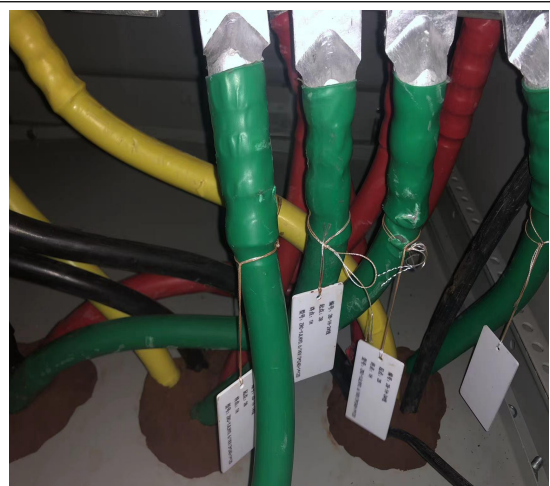

逆变器电缆标识牌安装、防火封堵



汇流柜电缆悬挂标识牌、防火封堵

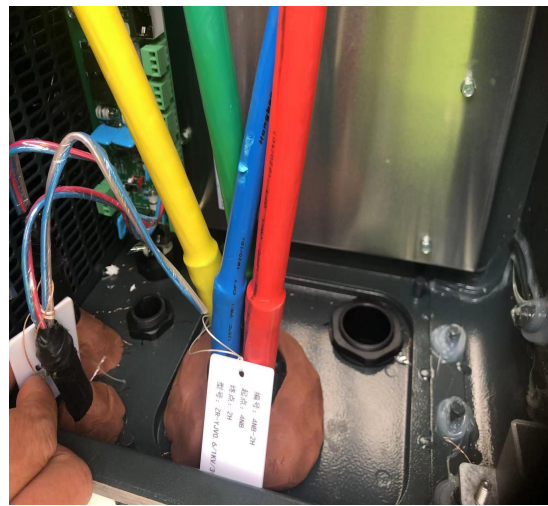

并网柜电缆悬挂标识牌、防火封堵

