

监理日报

2021 年 12 月 12 日 星期天 晴 1-11℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

- 1、支架地脚螺栓浇筑混凝土保护层 85%；
- 2、母排绝缘电阻测量完成：光伏区接地电阻测量完成；
- 3、接地环网与支架连接焊接完成 50%；
- 4、光伏组件安装 8 块，累计安装 1818，完成 100%；

施工人员 4 人，分包管理人员 2 人，总包管理人员 3 人；机械设备：叉车 1 台；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部组织对接地焊接施工人员安全技术交底，检查现场施工人员安全帽以及反光服佩戴情况，现场接地焊接时焊机周围未配备灭火器，已现场要求整改，目前安全状况良好；

质量：旁站光伏区接地环网接地电阻测试过程，测试结果符合设计要求，旁站母排绝缘电阻测量过程，测量结果符合设计及规范要求；检查接地扁钢与支架搭接长度，要求不低于扁钢宽度的 2 倍，测量结果符合要求；损坏的 10 块组件今日已到场，安装完成 8 块，剩余 2 块备品；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与计划进度相符；

母排绝缘电阻测量	光伏组件安装
----------	--------




10 块组件到场



接地电阻测试



扁钢与支架焊接

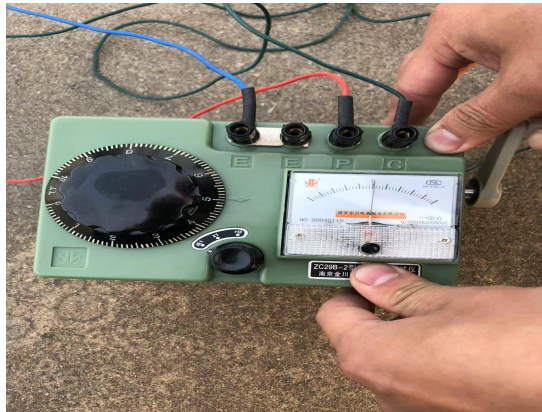

电缆井抹面

