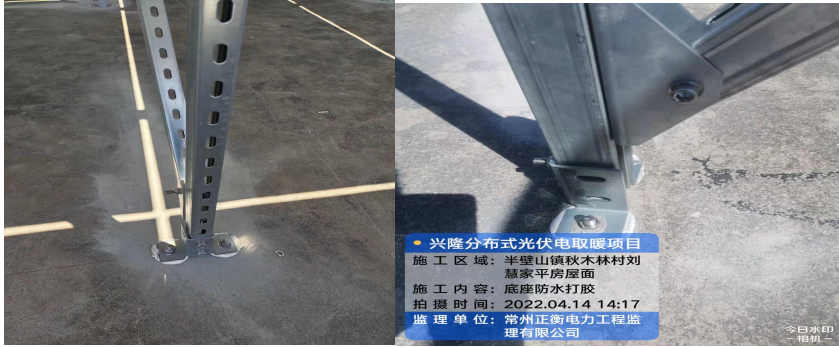


## 监理日志

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |    |       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|-------|
| 兴隆分布式光伏电取暖项目     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 日期 | 2022.4.14 |    |       |
| 天气               | 阴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 风力 | 3 级       | 温度 | 1-14℃ |
| 今日作业情况           | 1. 现场施工面 3 个，施工人员共 12 名。<br>2. 工作面 1: 半壁山镇小子庄村徐国东家平房屋面组件安装完成。3 排 36 块 550 组件。<br>3. 工作面 2: 半壁山镇秋木林村刘慧家平房屋面组件安装完成。4 排 60 块 550 组件。<br>4. 工作面 3: 半壁山镇河沿子村姜楠楠家平房屋面支架安装，组件安装完成。3 排 36 块 550 组件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |    |       |
| 明日工作计划           | 1. 班组长 2 人，工人 10 人。<br>2. 明日 2 户安装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |    |       |
| 到货及施工情况与协调问题     | <b>累积到货情况:</b> 组件到货 370*2800 块, 545*1000 块, 550*1950 块; 支架到货 500 组, 电缆到货 400 组, 配电箱 62 个, 逆变器 104 台, 电表箱现场无。<br><b>累积安装情况:</b> 支架 2.485MW, 组件 2.485MW。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |    |       |
| 不安全、质量不合规、屋顶防水照片 |  <div style="position: absolute; top: 640px; left: 525px; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; font-size: 0.8em;">                         • 兴隆分布式光伏电取暖项目<br/>                         施工区域: 半壁山镇秋木林村刘慧家平房屋面<br/>                         施工内容: 底座防水打胶<br/>                         拍摄时间: 2022.04.14 14:17<br/>                         监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司                     </div> |    |           |    |       |
| 其他事项             | 指导施工单位做过程报审资料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |    |       |

本日现场监理人员: 李连明

记录人: 李连明
