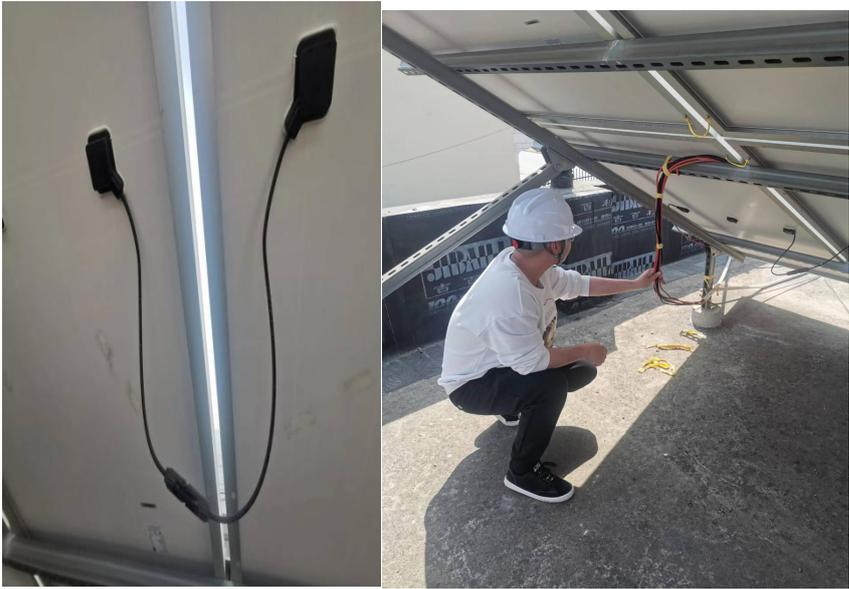


监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.4.19		
天气	晴	风力	4级	温度	8-23℃
今日作业情况	1. 现场施工面 0 个，施工人员共 0 名。 2. 验收 2 户。				
明日工作计划	1. 班组长 0 人，工人 0 人。 2. 由于缺少材料，明日屋面无人施工。 3. 验收 2 户。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*1950 块；支架到货 500 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 108 台，电表箱现场无。 累积安装情况： 支架 2.528MW，组件 2.528MW。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	经监理检查发现，半壁山村陆金路家平房屋面 MC4 接头连接不规范，交流电缆走线不规范，已现场告知整改。明日验收。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明
