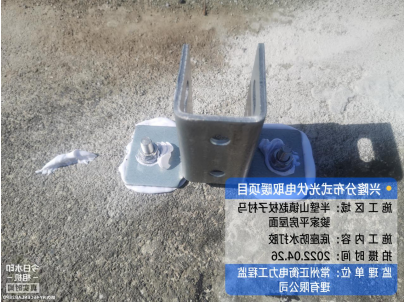


监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.4.26		
天气	阴	风力	2 级	温度	6-18℃
今日作业情况	1. 现场施工面 2 个，施工人员共 6 名。 2. 工作面 1：半壁山镇赵杖子村李仲国家平房屋面防水打胶，底座安装，支架安装。 3. 工作面 2：半壁山镇赵杖子村马俊家平房屋面防水防水打胶，底座安装，支架安装。				
明日工作计划	1.班组长 2 人，工人 4 人。 2.明日 2 户支架安装。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况：组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*1950 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 62 个，逆变器 108 台。 累积安装情况：支架 2.528MW，组件 2.528MW。 验收屋面：已验收完成 27 户。 已安装电表：4 户。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	今日验收完成 1 户。				

本日现场监理人员：李连明
记录人：李连明
