

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 66 日

编号:Z-F-GF-20221130


建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司	总包单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	管理单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
天气	阴 18—24℃	日期	2022 年 11 月 30 日
一、现场施工情况			
光伏区域工程	进度计划: 1. 组件安装、组串 5% 2. 桥架安装 10%	组件安装工程满足进度要求, 桥架、运维通道电缆、清洗系统安装滞后于进度要求	
	今日完成情况: 3. 组件安装、组串 5% 4. 桥架安装 10%		
	累计完成情况: 5. 支架安装 100% 6. 逆变器安装 100% 7. 护栏安装 100% 8. 桥架安装 20% 9. 组件安装、组串 30%		
设备到货	计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)	组件、逆变器到货进度满足进度计划要求, 清洗系统到货进度滞后于进度要求	
	今日到货: 无		
	主要设备累计到货: 组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 并网柜 2、汇流柜 4 台 电缆全部到场		



扫描全能王 创建

	桥架全部到场 集电母排 2 套	
人员、机械、材料投入	现场人员情况：EPC 管理方 1 人，监理 1 人，施工单位 16 人。 现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐车 0 辆，叉车 0 辆 现场材料在场情况：组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 接地扁铁全部到场 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 配电柜、汇流柜全部到场	1. 人员数量不满足现场施工要求 2. 机械投入情况满足现场使用要求 3. 材料供应运维通道、清洗系统滞后于进度计划要求
二、现场巡查情况		
1、监理过程资料整理编制 2、组件安装、组串、桥架安装巡视检查		
三、需业主单位协调事项：材料供应运维通道、清洗系统、滞后于进度计划要求，桥架、电缆敷设滞后于进度计划要求		
四、明日计划简述：1、施工过程资料整理报审 2、监理过程资料整理编制 3、组件安装、组串 4、桥架安装		
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 专业监理工程师（编制人）：陈大伟 总监理工程师（审核人）：王立杰		



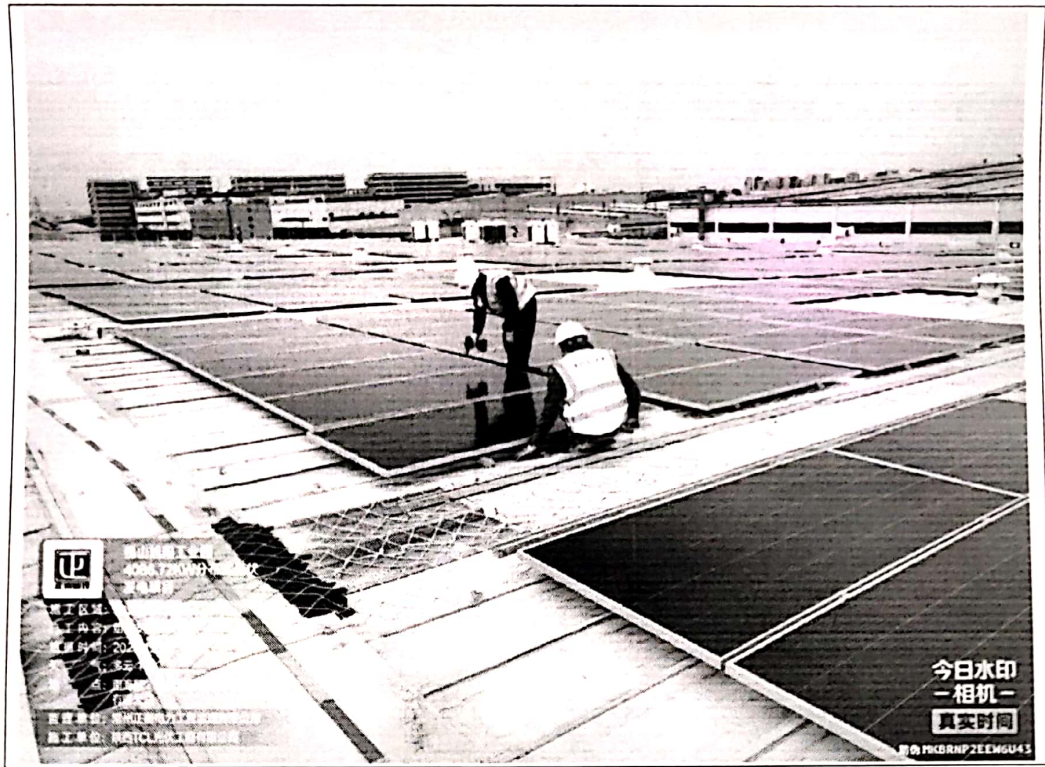

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 67 日

编号: Z-F-GF-20221201


建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司	总包单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	管理单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
天气	阴 14—24℃	日期	2022 年 12 月 1 日
一、现场施工情况			
光伏区域工程	进度计划: 1. 组件安装、组串 10% 2. 桥架安装 10%	组件安装工程满足进度要求, 桥架、运维通道电缆、清洗系统安装滞后于进度要求	
	今日完成情况: 3. 组件安装、组串 10% 4. 桥架安装 10%		
	累计完成情况: 5. 支架安装 100% 6. 逆变器安装 100% 7. 护栏安装 100% 8. 桥架安装 30% 9. 组件安装、组串 40%		
设备到货	计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)	组件、逆变器到货进度满足进度计划要求, 清洗系统到货进度滞后于进度要求	
	今日到货: 运维通道全部到场		
	主要设备累计到货: 组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 并网柜 2、汇流柜 4 台 电缆全部到场		



扫描全能王 创建

	桥架全部到场 集电母排 2 套 运维通道全部到场	
人员、机械、材料投入	现场人员情况：EPC 管理方 3 人，监理 1 人， 施工单位 20 人。 现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐 车 0 辆，叉车 0 辆 现场材料在场情况：组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 接地扁铁全部到场 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 配电柜、汇流柜全部到场 运维通道全部到场	1. 人员数量不满足现场施工 要求 2. 机械投入情况满足现场使 用要求 3. 材料供应清洗系统滞后于 进度计划要求
二、现场巡查情况		
1、监理过程资料整理编制		
2、组件安装、组串、桥架安装巡视检查		
三、需业主单位协调事项：材料供应清洗系统滞后于进度计划要求，桥架、电缆敷设滞后于进度计划要求		
四、明日计划简述：1、施工过程资料整理报审 2、监理过程资料整理编制 3、组件安装、组串 4、桥架安装		
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 专业监理工程师（编制人）：陈大伟 总监理工程师（审核人）：王立杰		



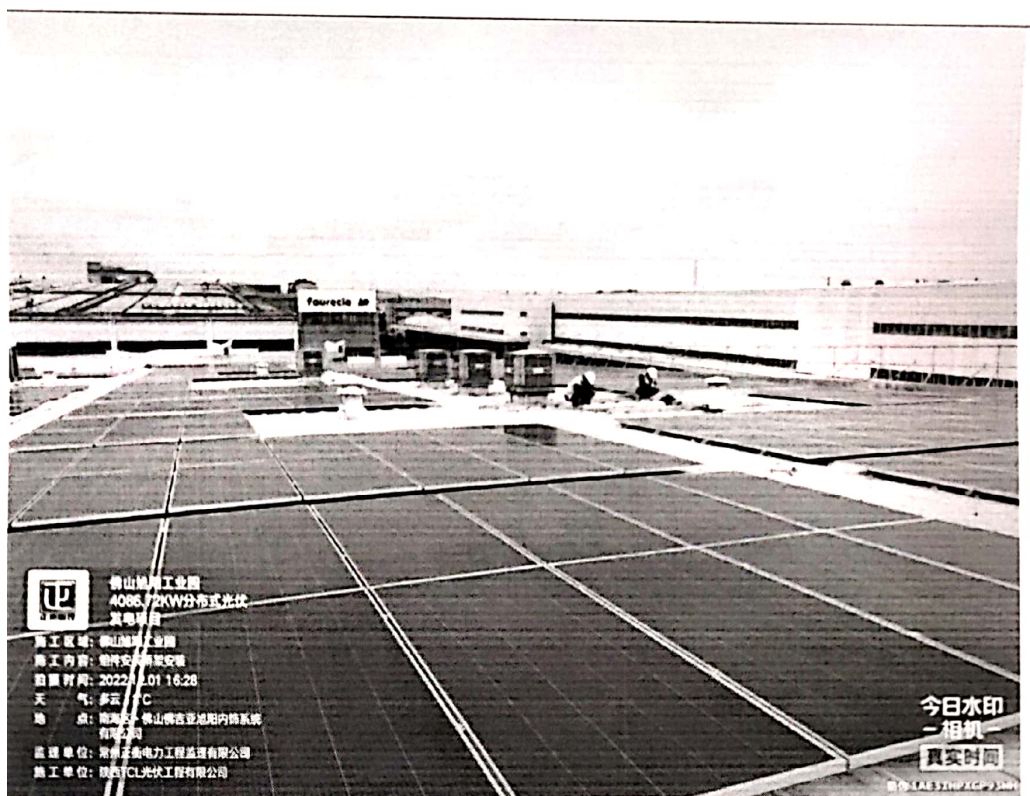

扫描全能王 创建

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 68 日

编号: Z-F-GF-20221202

建设单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司	总包单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	管理单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司
天气	阴 14—24℃	日期	2022 年 12 月 2 日
一、现场施工情况			
光伏区域工程	进度计划: 1. 组件安装、组串 10% 2. 桥架安装 10%	组件安装工程满足进度要求, 桥架、运维通道电缆、清洗系统安装滞后于进度要求	
	今日完成情况: 3. 组件安装、组串 10% 4. 桥架安装 10%		
	累计完成情况: 5. 支架安装 100% 6. 逆变器安装 100% 7. 护栏安装 100% 8. 桥架安装 40% 9. 组件安装、组串 50%		
设备到货	计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)	组件、逆变器到货进度满足进度计划要求, 清洗系统到货进度滞后于进度要求	
	今日到货: 无		
	主要设备累计到货: 组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 并网柜 2、汇流柜 4 台 电缆全部到场		



	桥架全部到场 集电母排 2 套 运维通道全部到场	
人员、机械、材料投入	现场人员情况：EPC 管理方 3 人，监理 1 人，施工单位 20 人。 现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐车 0 辆，叉车 0 辆 现场材料在场情况：组件 7470 片 逆变器入场 33 台 护栏材料全部到场 厂房支架材料全部到场 接地扁铁全部到场 电缆全部到场 桥架全部到场 集电母排 2 套 配电柜、汇流柜全部到场 运维通道全部到场	1. 人员数量不满足现场施工要求 2. 机械投入情况满足现场使用要求 3. 材料供应清洗系统滞后于进度计划要求
二、现场巡查情况		
1、监理过程资料整理编制 2、施工过程资料整理报审 3、组件安装、组串、桥架安装巡视检查 4、监理周例会		
三、需业主单位协调事项：材料供应清洗系统滞后于进度计划要求，桥架、电缆敷设滞后于进度计划要求		
四、明日计划简述：1、施工过程资料整理报审 2、监理过程资料整理编制 3、组件安装、组串 4、桥架安装		
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 专业监理工程师（编制人）：陈大伟 总监理工程师（审核人）：王立杰		





佛山旭阳工业园
4086.72KW分布式光伏
发电项目

施工区域: 佛山旭阳工业园

施工内容: 组件安装支架安装

拍摄时间: 2022.12.02 09:00

天气: 多云 7℃

地点: 南海区·佛山·佛吉亚旭阳内陈系统
有限公司

监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司

施工单位: 陕西TCL光伏工程有限公司

今日水印
相机
真实时间

设备 SUU12P1P1NPWTM



扫描全能王 创建
