

# 佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 95 日

编号: Z-F-GF-20221229

|          |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 建设单位     | 佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司                                                                                                                                                                                                                 | 总包单位          | 陕西 TCL 光伏工程有限公司  |
| 监理单位     | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                                                   | 管理单位          | 佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司 |
| 天气       | 阴 10—19℃                                                                                                                                                                                                                         | 日期            | 2022 年 12 月 29 日 |
| 一、现场施工情况 |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |
| 光伏区域工程   | 进度计划:<br>1. 监控系统安装 20%<br>2. 运维通道、接地网、清洗系统整改消缺                                                                                                                                                                                   | 监控系统安装滞后于进度要求 |                  |
|          | 今日完成情况:<br>3. 监控系统安装 20%<br>4. 运维通道、接地网、清洗系统整改消缺                                                                                                                                                                                 |               |                  |
|          | 累计完成情况:<br>5. 支架安装 100%<br>6. 逆变器安装 100%<br>7. 护栏安装 100%<br>8. 桥架安装 100%<br>9. 组件安装、组串 100%<br>10. 接地网敷设 100%<br>11. 交流电缆敷设 100%<br>12. 直流电缆敷设 100%<br>13. 交、直流电缆接线 100%<br>14. 运维通道安装 100%<br>15. 清洗管道敷设 100%<br>16. 监控系统安装 80% |               |                  |
| 设备到货     | 计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述)                                                                                                                                                                                                     |               |                  |
|          | 今日到货: 无                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |



扫描全能王 创建

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                        | <p>主要设备累计到货：组件 7470 片</p> <p>逆变器入场 33 台</p> <p>护栏材料全部到场</p> <p>厂房支架材料全部到场</p> <p>并网柜 2、汇流柜 4 台</p> <p>电缆全部到场</p> <p>桥架全部到场</p> <p>集电母排 2 套</p> <p>运维通道全部到场</p> <p>清洗系统全部到货</p>                                                                                                                      |                                                 |
| 人员、机械、材料投入                                                                             | <p>现场人员情况：EPC 管理方 3 人，监理 1 人，施工单位 6 人。</p> <p>现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐车 0 辆，叉车 0 辆</p> <p>现场材料在场情况：组件 6620 片</p> <p>逆变器入场 29 台</p> <p>护栏材料全部到场</p> <p>厂房支架材料全部到场</p> <p>接地扁铁全部到场</p> <p>电缆全部到场</p> <p>桥架全部到场</p> <p>集电母排 2 套</p> <p>配电柜、汇流柜全部到场</p> <p>运维通道全部到场</p> <p>清洗系统全部到货</p> <p>监控系统全部到货</p> | <p>1. 人员数量满足现场施工要求</p> <p>2. 机械投入情况满足现场使用要求</p> |
| 二、现场巡查情况                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| <p>1、监理竣工资料整理编制</p> <p>2、施工竣工资料整理报审</p> <p>3、运维通道、接地系统整改消缺巡视检查</p> <p>4、监控系统安装巡视检查</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |



三、需业主单位协调事项：无

四、明日计划简述：

- 1、施工竣工资料整理报审
- 2、监理竣工资料整理编制
- 3、接地系统、运维系统、清洗系统整改消缺
- 4、监控安装

编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师（编制人）：陈大伟

总监理工程师（审核人）：王立杰



# 佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 96 日

编号: Z-F-GF-20221230

|          |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 建设单位     | 佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司                                                                                                                                                                                                                  | 总包单位 | 陕西 TCL 光伏工程有限公司  |
| 监理单位     | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                                                    | 管理单位 | 佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司 |
| 天气       | 阴 10—17℃                                                                                                                                                                                                                          | 日期   | 2022 年 12 月 30 日 |
| 一、现场施工情况 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |
| 光伏区域工程   | 进度计划：<br>1. 监控系统安装 20%<br>2. 运维通道、接地网、清洗系统整改消缺                                                                                                                                                                                    |      |                  |
|          | 今日完成情况：<br>3. 监控系统安装 20%<br>4. 运维通道、接地网、清洗系统整改消缺                                                                                                                                                                                  |      |                  |
|          | 累计完成情况：<br>5. 支架安装 100%<br>6. 逆变器安装 100%<br>7. 护栏安装 100%<br>8. 桥架安装 100%<br>9. 组件安装、组串 100%<br>10. 接地网敷设 100%<br>11. 交流电缆敷设 100%<br>12. 直流电缆敷设 100%<br>13. 交、直流电缆接线 100%<br>14. 运维通道安装 100%<br>15. 清洗管道敷设 100%<br>16. 监控系统安装 100% |      |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |
| 设备到货     | 计划到货描述：（到货计划会不断调整，可在附件中描述）                                                                                                                                                                                                        |      |                  |
|          | 今日到货： 无                                                                                                                                                                                                                           |      |                  |



扫描全能王 创建

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                        | <p>主要设备累计到货：组件 7470 片</p> <p>逆变器入场 33 台</p> <p>护栏材料全部到场</p> <p>厂房支架材料全部到场</p> <p>并网柜 2、汇流柜 4 台</p> <p>电缆全部到场</p> <p>桥架全部到场</p> <p>集电母排 2 套</p> <p>运维通道全部到场</p> <p>清洗系统全部到货</p>                                                                                                                      |                                                 |
| 人员、机械、材料投入                                                                             | <p>现场人员情况：EPC 管理方 3 人，监理 1 人，施工单位 6 人。</p> <p>现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐车 0 辆，叉车 0 辆</p> <p>现场材料在场情况：组件 6620 片</p> <p>逆变器入场 29 台</p> <p>护栏材料全部到场</p> <p>厂房支架材料全部到场</p> <p>接地扁铁全部到场</p> <p>电缆全部到场</p> <p>桥架全部到场</p> <p>集电母排 2 套</p> <p>配电柜、汇流柜全部到场</p> <p>运维通道全部到场</p> <p>清洗系统全部到货</p> <p>监控系统全部到货</p> | <p>1. 人员数量满足现场施工要求</p> <p>2. 机械投入情况满足现场使用要求</p> |
| 二、现场巡查情况                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| <p>1、监理竣工资料整理编制</p> <p>2、施工竣工资料整理报审</p> <p>3、运维通道、接地系统整改消缺巡视检查</p> <p>4、监控系统安装巡视检查</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |



三、需业主单位协调事项：无

四、明日计划简述：

1、施工竣工资料整理报审


2、监理竣工资料整理编制

3、单位工程初验收

编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师（编制人）：陈大伟

总监理工程师（审核人）：王立杰

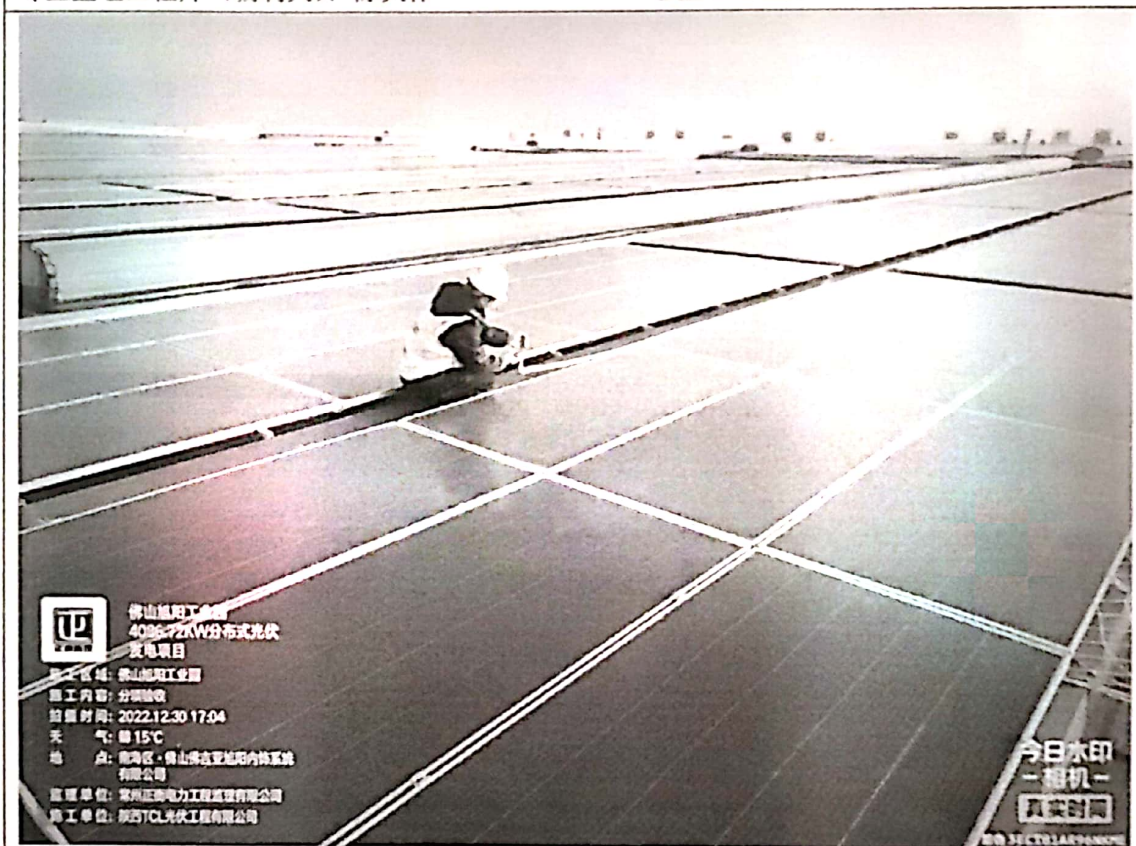

扫描全能王 创建

# 佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目监理日报

总第 97 日

编号: Z-F-GF-20221231

|                 |                              |      |                  |
|-----------------|------------------------------|------|------------------|
| 建设单位            | 佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司             | 总包单位 | 陕西 TCL 光伏工程有限公司  |
| 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司               | 管理单位 | 佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司 |
| 天气              | 阴 10—20℃                     | 日期   | 2022 年 12 月 31 日 |
| 一、现场施工情况        |                              |      |                  |
| 光伏区域工程          | 进度计划:                        |      |                  |
|                 | 1. 单位工程初验收                   |      |                  |
|                 | 今日完成情况:                      |      |                  |
|                 | 2. 单位工程初验收                   |      |                  |
|                 | 累计完成情况:                      |      |                  |
|                 | 3. 支架安装 100%                 |      |                  |
|                 | 4. 逆变器安装 100%                |      |                  |
|                 | 5. 护栏安装 100%                 |      |                  |
|                 | 6. 桥架安装 100%                 |      |                  |
|                 | 7. 组件安装、组串 100%              |      |                  |
|                 | 8. 接地网敷设 100%                |      |                  |
|                 | 9. 交流电缆敷设 100%               |      |                  |
|                 | 10. 直流电缆敷设 100%              |      |                  |
|                 | 11. 交、直流电缆接线 100%            |      |                  |
| 12. 运维通道安装 100% |                              |      |                  |
| 13. 清洗管道敷设 100% |                              |      |                  |
| 14. 监控系统安装 100% |                              |      |                  |
| 设备到货            | 计划到货描述: (到货计划会不断调整, 可在附件中描述) |      |                  |
|                 | 今日到货: 无                      |      |                  |
|                 | 主要设备累计到货: 组件 7470 片          |      |                  |



扫描全能王 创建

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                           | 逆变器入场 33 台<br>护栏材料全部到场<br>厂房支架材料全部到场<br>并网柜 2、汇流柜 4 台<br>电缆全部到场<br>桥架全部到场<br>集电母排 2 套<br>运维通道全部到场<br>清洗系统全部到货<br>监控系统全部到货                                                                                                                |                                      |
| 人员、机械、材料投入                                | 现场人员情况：EPC 管理方 3 人，监理 1 人，施工单位 6 人。<br>现场机具在场情况：主吊 0 台，泵车 0 辆，罐车 0 辆，叉车 0 辆<br>现场材料在场情况：组件 6620 片<br>逆变器入场 29 台<br>护栏材料全部到场<br>厂房支架材料全部到场<br>接地扁铁全部到场<br>电缆全部到场<br>桥架全部到场<br>集电母排 2 套<br>配电柜、汇流柜全部到场<br>运维通道全部到场<br>清洗系统全部到货<br>监控系统全部到货 | 1. 人员数量满足现场施工要求<br>2. 机械投入情况满足现场使用要求 |
| 二、现场巡查情况                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| 1、监理竣工资料整理编制<br>2、施工竣工资料整理报审<br>3、单位工程初验收 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| 三、需业主单位协调事项：无                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |



#### 四、明日计划简述:

- 1、施工竣工资料整理报审
- 2、监理竣工资料整理编制
- 3、初验收后整改消缺

编制单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师 (编制人): 陈大伟

总监理工程师 (审核人): 王立杰

