

日报

中车株洲电力机车有限公司 屋顶光伏发电项目		日期	2023.02.19		
天气	多云	风力	2 级	温度	6-17℃
今日作业 情况	1、施工人数 施工人数 6 人 2、施工机械 叉车 2 台、吊车 1 台 今日完成工作： 1、原铸造车间存放的光伏材料转运； 2、B10---14 屋顶光伏电缆 PV1-F-0.6/1KV-1*4 电缆敷设 4200 米。 3、电缆 PV1-F-0.6/1KV-1*4 到货 2 万米； 4、电缆 ZC-YJLHV22-0.6/1KV-3*120+1*70 到货 3400 米；				
明日工作 计划	B10--14 屋顶光伏板组串电缆敷设；				
到货累计 数量	中车项目到货 1.组件到货 14200 块，（7.77MW）。 2.逆变器共计 60 台，已全部进场。 3.支架共计到货 2.5MW，32%。 4.MC4 接头共计到货 4MW，51%。 5.桥架共计到货 1.5MW，19%。 6.光伏电缆共计到货 1.5MW，19%。 7.接地线共计到货 5MW，64% 8.接地扁钢共计到货 2.5MW，32% 9.电力电缆共计到货 1.5MW，19% 10.并网柜到货 2 台。				
今日监理 工作情况	1、检查施工现场及光伏材料转运现场安全； 2、巡视 B10-14 屋顶光伏电缆 PV1-F-0.6/1KV-1*4 电缆敷设，符合设计要求； 3、检查 PV1-F-0.6/1KV-1*4、ZC-YJLHV22-0.6/1KV-3*120+1*70 电缆，符合合同及设计要求；				
其他事项或 协调问题					

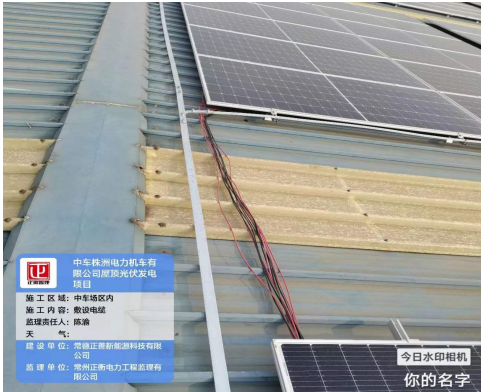
本日现场监理人员：

记录人：陈渝

项目总体建设进度汇总：

- 1、430 项目已进入消缺、并网。
- 2、B10-B14 屋顶光伏组件安装完成 4591 块。
- 3、B10-B14 组串 MC4 插头完成 300 套。
- 4、B10-B14 屋顶电缆桥架安装 700 米。
- 5、B10-B14 屋顶光伏支架安装 20%。
- 6、B10-B14 屋顶光伏电缆敷设完成 4000 米。
- 7、电力电缆敷设完成 600 米。
- 8、B10-B14 屋顶光接地扁铁安装完成 1600 米。
- 9、B10-B14 屋顶光伏组件接地线安装完成 3000 米。
- 10、B10-B14 屋顶逆变器安装 3 台。

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	光伏组件转运	电缆敷设
照片		
文字描述	电缆敷设	电缆敷设
照片		
