

日报

| | | | | | |
|--------------------------|--|----|------------|----|-------|
| 中车株洲电力机车有限公司 屋顶光伏发电项目 | | 日期 | 2023.03.09 | | |
| 天气 | 小雨 | 风力 | 2 级 | 温度 | 8-24℃ |
| 今日作业 情况 | <p>1、施工人数 施工人数 15 人</p> <p>2、施工机械 无</p> <p>今日完成工作：</p> <p>1、B10—B15 备料变配电室到逆变器的 6 根 3*120+1*70 已敷设到位。</p> <p>2、B10—B15 联合变配电房铝芯电缆 3*120+1*70 敷设到了配电房屋顶，等待电缆井开好洞就直接入柜</p> | | | | |
| 明日工作 计划 | B10—B15 屋顶交流铝芯电缆 3*120+1*70 电缆头制作安装，直流电缆套波纹管。联合变配电房配电柜底下砌砖等 | | | | |
| 到货累计 数量 | <p>中车项目到货</p> <p>1.组件到货 14200 块，（7.77MW）。</p> <p>2.逆变器共计 60 台，已全部进场。</p> <p>3.支架共计到货 2.5MW，32%。</p> <p>4.MC4 接头共计到货 4MW，51%。</p> <p>5.桥架共计到货 1.5MW，19%。</p> <p>6.光伏电缆共计到货 1.5MW，19%。</p> <p>7.接地线共计到货 5MW，64%</p> <p>8.接地扁钢共计到货 2.5MW，32%</p> <p>9.电力电缆共计到货 1.5MW，19%</p> <p>10.并网柜到货 2 台。</p> | | | | |
| 今日监理 工作情况 | <p>1、巡视现场安全，无安全隐患；</p> <p>2、巡视 B10—B15 备料变配电室敷设电缆至逆变器，符合设计要求；</p> <p>3、巡视 B10—B15 联合变配电房敷设电缆，符合设计要求；</p> | | | | |
| 其他事项或 协调问题 | | | | | |

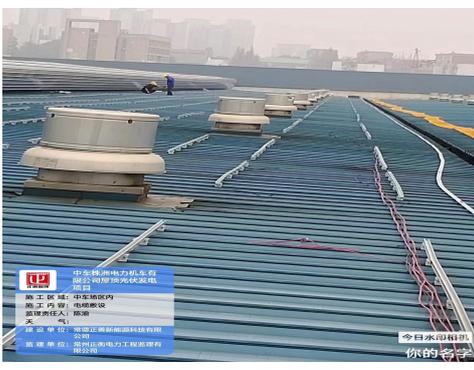
本日现场监理人员：

记录人：陈渝

项目总体建设进度汇总：

- 1、430 项目已进入消缺、并网。
- 2、B10-B14 屋顶光伏组件安装完成 4591 块。
- 3、B10-B14 组串 MC4 插头完成 300 套。
- 4、B10-B14 屋顶电缆桥架安装 700 米。
- 5、B10-B14 屋顶光伏支架安装 20%。
- 6、B10-B14 屋顶光伏电缆敷设完成 4000 米。
- 7、电力电缆敷设完成 600 米。
- 8、B10-B14 屋顶光接地扁铁安装完成 1600 米。
- 9、B10-B14 屋顶光伏组件接地线安装完成 3000 米。
- 10、B10-B14 屋顶逆变器安装 3 台。

工程现场照片：（含文字描述）

| 文字描述 | 敷设电缆 | 敷设电缆 |
|------|---|--|
| 照片 |  |  |
| 文字描述 | 敷设电缆 | 敷设电缆 |
| 照片 |  |  |
