

日报

中车株洲电力机车有限公司 屋顶光伏发电项目		日期	2023.04.07		
天气	多云	风力	2 级	温度	8-24℃
今日作业 情况	1、施工人数 施工人数 15 人 2、施工机械 无 今日完成工作： 1、B08-B09 屋顶光伏组件完成 1000 块； 2、B08-B09 屋顶逆变器支架安装完成 8 个； 3、B08-B09 屋顶光伏电缆敷设；				
明日工作 计划	d2 屋顶中间部分支架安装，b08 屋顶逆变器安装，光伏组串，桥架制作安装				
到货累计 数量	中车项目到货 1.组件到货 14200 块，（7.77MW）。 2.逆变器共计 60 台，已全部进场。 3.支架共计到货 2.5MW，32%。 4.MC4 接头共计到货 4MW，51%。 5.桥架共计到货 1.5MW，19%。 6.光伏电缆共计到货 1.5MW，19%。 7.接地线共计到货 5MW，64% 8.接地扁钢共计到货 2.5MW，32% 9.电力电缆共计到货 1.5MW，19% 10.并网柜到货 2 台。				
今日监理 工作情况	1、巡视现场安全，无安全隐患； 2、巡视 B08-B09 屋顶光伏组件，符合设计要求； 3、巡视 B08-B09 屋顶逆变器支架安装，符合设计要求； 4、巡视 B08-B09 屋顶光伏电缆敷设，符合设计要求；				
其他事项或 协调问题					

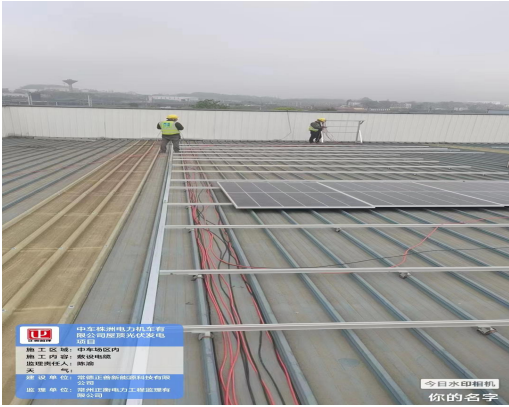
本日现场监理人员：

记录人：陈渝

项目总体建设进度汇总：

- 1、430 项目已进入消缺、并网。
- 2、B10-B14 屋顶光伏组件安装完成 4591 块。
- 3、B10-B14 组串 MC4 插头完成 300 套。
- 4、B10-B14 屋顶电缆桥架安装 700 米。
- 5、B10-B14 屋顶光伏支架安装 20%。
- 6、B10-B14 屋顶光伏电缆敷设完成 4000 米。
- 7、电力电缆敷设完成 600 米。
- 8、B10-B14 屋顶光接地扁铁安装完成 1600 米。
- 9、B10-B14 屋顶光伏组件接地线安装完成 3000 米。
- 10、B10-B14 屋顶逆变器安装 3 台。

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	光伏电缆敷设	光伏组件安装
照片		
文字描述	光伏组件安装	逆变器支架
照片		
