

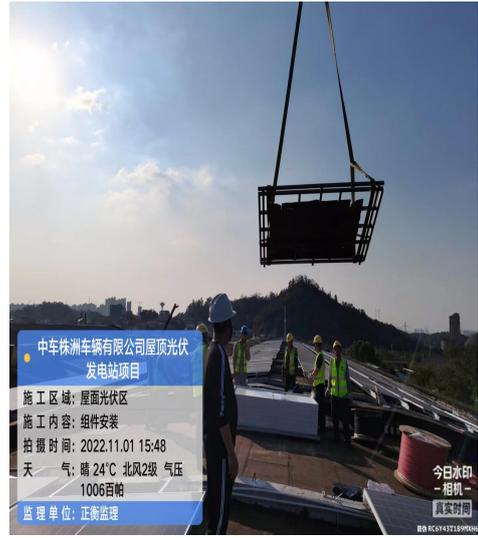
日报

| | | | | | |
|-------------------------|---|----|------------|----|--------|
| 中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏发电站项目 | | 日期 | 2022.11.01 | | |
| 天气 | 晴 | 风力 | 1 级 | 温度 | 14-24℃ |
| 今日作业 情况 | <p>1、施工人数 电缆沟回填 4 人，条基接头浇筑 6 人，电气施工 20 人。</p> <p>2、施工机械 随车吊 2 台</p> <p>3、今日完成工作： 1.2#组装条基吊装完成 200 米； 2.组件吊装完成 527 块块。； 3.直流电缆敷设完成 2000 米； 4.组件铺设完成 527 块；</p> | | | | |
| 明日工作 计划 | <p>1. 直流电缆敷设， 2. 组装条基吊装， 3. 组件吊装， 4. 组件安装。</p> | | | | |
| 到货累计 数量 | <p>1.组件到货 5100 块。（3.06MW）。 2.逆变器共计 11 台。已全部进场。 3.支架共计 160 组。已全部进场。 4.MC4 接头共计 640 套。已全部进场。 5.桥架共计 1013 米。已全部进场。 6.光伏电缆共计 29000 米。已全部进场。 7.接地线共计 1431 米。已全部进场。 8.接地扁钢共计 2520 米。已全部进场。 9.电力电缆共计 2132 米。已全部进场。</p> | | | | |
| 今日监理 工作情况 | <p>1. 监理安全旁站组件吊装，要求施工单位安全员及时就位，吊装区域周围拉上安全警戒线。 2. 监理检查现场组件散料铺设，要求施工单位散料人员，禁止一人肩扛，背扛，必须两人抬放。 3. 监理巡视检查直流电缆敷设情况。</p> | | | | |
| 其他事项 或协调问 题 | | | | | |

本日现场监理人员：

记录人：

工程现场照片：（含文字描述）

| | | |
|-------------|---|--|
| <p>文字描述</p> | <p>组件吊装</p> | <p>监理安全旁站组件吊装</p> |
| <p>照片</p> |  |  |
| <p>文字描述</p> | <p>组件散料铺设</p> | <p>组件准备吊装</p> |
| <p>照片</p> |  |  |
