

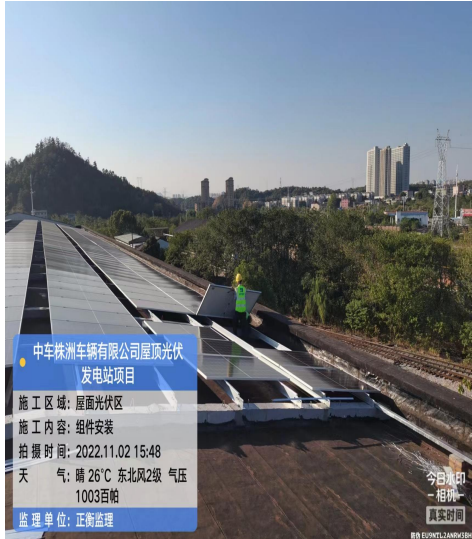
日报

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏电站项目		日期	2022.11.02		
天气	晴	风力	1 级	温度	16-25℃
今日作业 情况	1、施工人数 条基吊装 10 人，条基钢筋绑扎 1 人，电气施工 20 人。 2、施工机械 随车吊 1 台 3、今日完成工作： 1.2#组装条基吊装完成 150 米；累计完成 3500/5000 米。 2.组件安装完成 300 块；累计完成 950/5100 块。 3.直流电缆敷设完成 1500 米；累计完成 7500/29000 米。				
明日工作 计划	1. 直流电流敷设， 2. 条基吊装， 3. 组件安装。				
到货累计 数量	1.组件到货 5100 块。（3.06MW）。 2.逆变器共计 11 台。已全部进场。 3.支架共计 160 组。已全部进场。 4.MC4 接头共计 640 套。已全部进场。 5.桥架共计 1013 米。已全部进场。 6.光伏电缆共计 29000 米。已全部进场。 7.接地线共计 1431 米。已全部进场。 8.接地扁钢共计 2520 米。已全部进场。 9.电力电缆共计 2132 米。已全部进场。				
今日监理 工作情况	1. 监理安全旁站条基吊装，要求施工单位安全员及时就位，吊装区域周围拉上安全警戒线。 2. 监理检查现场组件安装，要求现场施工人员按规范要求安装。 3. 监理巡视检查直流电缆敷设情况。要求桥架内敷设线路排列整齐，不能有缠绞现象。				
其他事项 或协调问 题					

本日现场监理人员：

记录人：

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	工人安装制作条基模板	屋面现场工人安装组件
照片	 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工区域：屋面光伏区 施工内容：条基制作 拍摄时间：2022.11.02 15:41 天气：晴 25℃ 东北风1级 气压 1003百帕 监理单位：正衡监理	 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工区域：屋面光伏区 施工内容：组件安装 拍摄时间：2022.11.02 15:48 天气：晴 26℃ 东北风2级 气压 1003百帕 监理单位：正衡监理
文字描述	制作条基	组件安装
照片	 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工区域：屋面光伏区 施工内容：条基制作 拍摄时间：2022.11.02 15:40 天气：晴 25℃ 东北风1级 气压 1003百帕 监理单位：正衡监理	 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 施工区域：屋面光伏区 施工内容：组件安装 拍摄时间：2022.11.02 15:49 天气：晴 26℃ 东北风2级 气压 1003百帕 监理单位：正衡监理
