

日报

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏电站项目		日期	2022.12.14		
天气	晴	风力	1 级	温度	2-12℃
今日作业 情况	1、施工人数 条基封边 15 人，拉杆安装 5 人，组件吊装 15 人，支架划线打孔 2 人， 电气施工 10 人 2、施工机械 吊车 1 台 3、今日完成工作： 1、2#组装条基接头完成 240 个 2、条基封边完成 600 米 3、沥青防腐完成 200 米 4、2#组装桥架安装完成 200 米 5、组件吊装及就位完成 434 块 6、拉杆安装完成 60 根				
明日工作 计划	1. 2#组装组件安装 2. 2#组装直流电缆敷设 3. 2#组装条基封边及连接浇筑				
到货累计 数量	1.组件到货 5100 块。（3.06MW）。 2.逆变器共计 11 台。已全部进场。 3.支架共计 160 组。已全部进场。 4.MC4 接头共计 640 套。已全部进场。 5.桥架共计 1013 米。已全部进场。 6.光伏电缆共计 29000 米。已全部进场。 7.接地线共计 1431 米。已全部进场。 8.接地扁钢共计 2520 米。已全部进场。 9.电力电缆共计 2132 米。已全部进场。 10.箱变已进场。				
今日监理 工作情况	1.安全旁站组件吊装，要求吊装前周围拉好安全警戒线，检查钢丝绳，安全员及时就位。 2.巡视检查 2#备料车间条基封边安装情况，要求施工人员按规范安装。 3.检查 2#备料车间屋面桥架安装情况，要求施工人员按规范安装。				
其他事项或 协调问题					

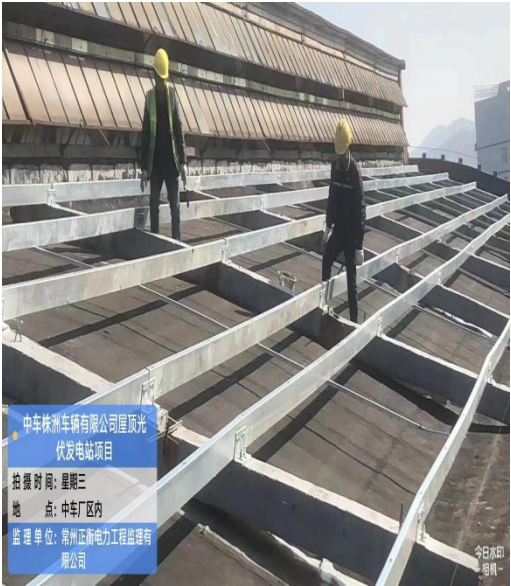
本日现场监理人员：

记录人：

项目总体建设进度汇总：

1. 组件安装完成 1860 块，共计 5100，完成 36.47%；
2. 条基预制完成 5000 米，共计 5000 米，完成 100%；
3. 支架安装 110 组，共计 160 组，完成 68.75%；
4. 逆变器共计 11 台，已全部进场；
5. 桥架安装共计 1013 米，安装 950 米，完成 93.78%。
6. 光伏电缆敷设 13200 米，共计 29000 米，完成 45.52%。
7. 接地扁铁焊接 400 米，共计 2520 米，完成 15.87%。
8. 接地极 15 根，完成 100%。
9. 高压电缆敷设完成 1700 米，共计 2123 米，完成 79.74%。
10. MC4 接头插件安装完成 150 套，共计 640 套，完成 23.44%。
11. 接地线连接完成 500 米，共计 1431 米，完成 34.94%。

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	电缆沟开挖	条基连接及封边
照片	 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 拍摄时间：星期三 地点：中车厂区内 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 拍摄时间：星期三 地点：中车厂区内 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
文字描述	条基连接及封边	
照片	 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目 拍摄时间：星期三 地点：中车厂区内 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
